



# Relatório de Progresso Anual

## Programa Redd Early Movers (REM) Acre Fase II

1º de julho de 2023 – 30 de junho de 2024

Rio Branco - Acre  
Agosto de 2024



UK Government



Por meio do:

KfW



SEPLAN  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO



GOVERNO DO  
ACRE  
Trabalho para cultivar dos povos

## Fontes de informações:

As informações aqui compiladas representam uma sistematização das atividades e resultados obtidos a partir da atuação das seguintes instituições estaduais executoras, responsáveis pela implementação das atividades previstas no Programa REM Acre Fase II:

- Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais - CDSA
- Corpo de Bombeiros Militar do Acre - CBMAC
- Fundação de Tecnologia do Estado do Acre - FUNTAC
- Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC
- Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais do Estado do Acre - IMC
- Instituto de Terras do Acre - ITERACRE
- Polícia Militar do Estado do Acre - Batalhão de Policiamento Ambiental – BPA
- Secretaria de Estado de Agricultura - SEAGRI
- Secretaria de Estado de Comunicação - SECOM
- Secretaria de Estado de Educação – SEE
- Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP / Centro Integrado de Operações Aéreas - CIOPAER
- Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMA
- Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas - SEPI
- Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN
- Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo - SETE

## Sistematização e redação:

UCP-REM SEPLAN e Consultoria Internacional



# Índice

Lista de Figuras.....	4
Abreviações .....	5
<b>1 . Resumo Executivo .....</b>	<b>6</b>
1.1 Contextualização .....	6
1.2 Desafios identificados na implementação do Programa e estratégias de superação adotadas.....	8
1.3 Elaboração e formalização do Plano Estadual de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Queimadas do Acre – PPCDQ-AC.....	10
1.4 Análise e avaliação dos projetos para definição do novo PDI 2024-2026 .....	12
1.5 Balanço da Ouvidoria.....	18
1.6 Acompanhamento dos 7 Indicadores de Sucesso da Matriz Lógica.....	19
<b>2. Tendências do Desmatamento no Estado do Acre e nas propriedades dos Beneficiários do Programa REM .....</b>	<b>20</b>
<b>3. Processo de análise a avaliação dos projetos de cada Executora do Programa .....</b>	<b>25</b>
<b>4. Execução financeira do Programa .....</b>	<b>33</b>
4.1 Execução financeira geral e por Subprograma .....	33
4.2 Execução financeira por Executora .....	35
<b>ANEXOS</b> (Planilhas Excel anexadas ao documento).....	<b>44</b>
Anexo 1 - Aquisições e Contratações - 2023 .....	44
Anexo 2 - Aquisições e Contratações - 2024.....	44

## Lista de Figuras

Figura 1: Territórios de atuação do Programa REM Fase 2 por Subprograma .....	7
Figura 2: Metas de redução do desmatamento previstas no PPCDQ-AC.....	9
Figura 3: Taxas de desmatamento no Acre 1988 - 2023 (km <sup>2</sup> ) .....	10
Figura 4: Cronograma de construção do novo PPCDQ-AC 2023-2027 .....	11
Figura 5: Alcance das metas e novas metas para o novo PDI 2024-2026 .....	13
Figura 6: Manifestações para a Ouvidoria (2023 – 2024) .....	18
Figura 7: Situação dos 7 Indicadores de Sucesso do Programa em 30/06/2024 .....	19
Figura 8: Tendências antagônicas na comparação entre o desmatamento no estado do Acre e o desmatamento nas propriedades dos beneficiários do Programa REM (2019 - 2022) .....	20
Figura 9: Geolocalização dos Beneficiários do Programa REM Fase II .....	22
Figura 10: Taxa de desmatamento nas propriedades dos beneficiários do Programa REM.....	22
Figura 11: Desmatamento nas propriedades dos beneficiários do Programa REM, .....	24
Figura 12: Desmatamento nas propriedades dos beneficiários do Programa REM, considerando apenas os subprogramas Produção Familiar Sustentável e Pecuária Diversificada Sustentável.....	24
Figura 13: Metodologia usada para a Avaliação dos Projetos .....	25
Figura 14: Resumo do Desempenho do Programa REM .....	26
Figura 15: Desempenho segundo a Repartição de Benefícios (70% x 30%).....	26
Figura 16: Desempenho por Subprograma .....	26
Figura 17: Desempenho no Componente REDD+ e SISA .....	27
Figura 18: Desempenho por Executora .....	27
Figura 19: Execução Financeira por Executora .....	27
Figura 20: Desempenho por Executora: SEAGRI .....	28
Figura 21: Desempenho por Executora: SEPI.....	28
Figura 22: Desempenho por Executora: SEMA .....	28
Figura 23: Desempenho por Executora: SEE .....	29
Figura 24: Desempenho por Executora: CDSA.....	29
Figura 25: Desempenho por Executora: FUNTAC .....	29
Figura 26: Desempenho por Executora: SETE.....	29
Figura 27: Desempenho por Executora: IMC .....	29
Figura 28: Desempenho por Executora: BPA.....	31
Figura 29: Desempenho por Executora: CIOPAER .....	31
Figura 30: Desempenho por Executora: CBMAC.....	31
Figura 31: Desempenho por Executora: IMAC .....	32
Figura 32: Desempenho por Executora: ITERACRE .....	32
Figura 33: Desempenho por Executora: SECOM .....	32
Figura 34: Execução financeira até 06/2024 (em R\$ e porcentagem do total desembolsado) .....	33
Figura 35: Execução financeira por ano até 30/06/2024 (em milhões de R\$).....	33
Figura 36: Execução financeira por Subprograma (contratado x planejado; em % até 12/2023) .....	34
Figura 37: Execução Financeira por Executora – até dezembro de 2023 (em R\$) .....	39
Figura 38: Execução Financeira segundo a Repartição de Benefícios – Pagamentos por ano até dezembro de 2023 (em R\$) .....	39
Figura 39: Pagamento de Diárias por Secretaria – em 31/12/2022 (em R\$).....	41
Figura 40: Licitações em 2022 por Subexecutora .....	42
Figura 41: Movimentação financeira na conta do Programa REM até 30/06/2024.....	43

## Abreviações

ART / TREES	<i>Architecture for REDD+ Transactions / The REDD+ Environmental Excellence Standard</i>
BEIS	Ministério do Reino Unido para Negócios, Energia e Estratégia Industrial ( <i>Department for Business, Energy &amp; Industrial Strategy</i> )
BPA	Batalhão de Policiamento Ambiental
CBMAC	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre
CDSA	Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais
CEVA	Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento
CGMC	Comitê Gestor de Mudanças Climáticas do Estado do Acre
CI	Consultoria Internacional
CIOPAER	Centro Integrado de Operações Aéreas / Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP
CTI	Câmara Temática Indígena
CTM	Câmara Temática de Mulheres
FREL	Nível de Referência de Emissões Florestais ( <i>Forest Reference Emission Level</i> )
FUNTAC	A Fundação de Tecnologia do Estado do Acre
GFA	GFA Consulting Group GmbH
GIZ	Agência de Cooperação Técnica Alemã ( <i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i> )
IMAC	Instituto de Meio Ambiente do Acre
IMC	Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais
KfW	Banco Alemão de Desenvolvimento ( <i>KfW Entwicklungsbank</i> )
LEAF	<i>Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance</i>
MEL	<i>Monitoring, Evaluation and Learning</i> (Monitoramento, Avaliação e Aprendizagem)
MOP	Manual Operacional do Programa
PDI	Plano de Investimento
POA	Plano Operativo Anual
PPCDQ/AC	Plano Estadual de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Queimadas do Acre
REDD+	Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal
REM	<i>REDD for Early Movers</i>
SEE	Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes
SEAGRI	Secretaria de Estado de Agricultura
SECOM	Secretaria de Estado de Comunicação
SEE	Secretaria de Estado de Educação
SEJUSP	Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
SEMA	Secretaria de Estado do Meio Ambiente
SEPI	Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas
SEPLAN	Secretaria de Estado de Planejamento
SETE	Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
SGRSA	Sistema de Gestão de Risco Socioambiental
UCP-REM	Unidade de Coordenação do Programa REM / SEPLAN

# 1. Resumo Executivo

## 1.1 Contextualização

O presente relatório apresenta os avanços alcançados na implementação do Programa REM Acre Fase II **até 30 de junho de 2024**. O Programa faz parte da iniciativa global REDD+ *Early Movers* (REM) do governo Alemão, que apoia programas nacionais e subnacionais de REDD+. No Acre, o Programa se materializa mediante compromisso formal entre o Governo do Estado do Acre e os agentes financiadores dos governos da Alemanha (Ministério da Cooperação - BMZ, através do KfW Banco de Desenvolvimento) e do Reino Unido (Ministério para Negócios, Energia e Estratégia Industrial - BEIS), sendo desenvolvido no âmbito do Contrato de Contribuição Financeira (KfW 201669092) e do Contrato Financeiro de Implementação (BEIS).

O Programa está inserido no arcabouço político-jurídico do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais do Estado do Acre - SISA (Lei 2.308/2010), que visa a redução do desmatamento através de incentivos a políticas públicas estaduais, que promovem o desenvolvimento sustentável e fomentam cadeias produtivas, gerando renda e promovendo o desenvolvimento social dos beneficiários do SISA.

A estrutura do Programa é baseada na estratégia de Repartição de Benefícios, implementada por meio de duas linhas de apoio. A primeira, de até **30%** do total dos recursos, destina-se às ações do componente **Fortalecimento e consolidação do SISA e seus mecanismos de REDD+**, visando apoiar ações e atividades que contribuam para o fortalecimento do arranjo institucional criado pela Lei do SISA, tais como: capacitação para integrantes das instâncias de governança do Sistema (CEVA / CT Indígena e CT Mulher, Comitê Científico, Ouvidoria); estudos e trabalhos para melhorar a base de informações do SISA; geração e gestão de conhecimento, comunicação e produção de material de divulgação; salvaguardas; processos de Monitoramento, Reporte e Verificação (MRV); intercâmbio de experiências em foros nacionais e internacionais para divulgação de lições aprendidas; comando e controle do desmatamento e queimadas; gestão de unidades de conservação (UC); ordenamento territorial; e gestão operacional administrativa, técnica e financeira do próprio Programa.


Os outros **70%** são destinados aos **beneficiários diretos** do Programa, seguindo as diretrizes de proteção florestal e fomento às cadeias produtivas sustentáveis, por meio da implantação de **três Subprogramas**:

- 1) **Territórios Indígenas**, que tem o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida dos povos indígenas, bem como a redução de emissões de gases de efeito estufa por desmatamento e degradação, a diminuição do fluxo de carbono, o manejo florestal sustentável e a conservação, manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal nas terras indígenas;

- 2) **Territórios de Produção Familiar Sustentável**, que visa fortalecer cada Território e Zona definidos pelo ZEE, projetos produtivos sustentáveis desenvolvidos por produtores tradicionais, extrativistas e agricultores familiares que possam receber pagamentos monetários pelos serviços ambientais na redução das emissões, manutenção ou aumento do estoque de carbono florestal e
- 3) **Pecuária Diversificada Sustentável**, que visa ampliar tais ações no Estado por meio do incremento da produtividade e diversificação da criação de animais; incentivar a recuperação de áreas degradadas; reduzir a pressão sob novas áreas de florestas, a fim de evitar o desmatamento e/ou queimadas; e fomentar atividades que mantenham e ampliem a oferta dos serviços ecossistêmicos.

A **Figura 1** localiza estes territórios de atuação previstos para a implementação dos projetos no âmbito da Fase II do Programa REM Acre.

**Figura 1: Territórios de atuação do Programa REM Fase 2 por Subprograma**

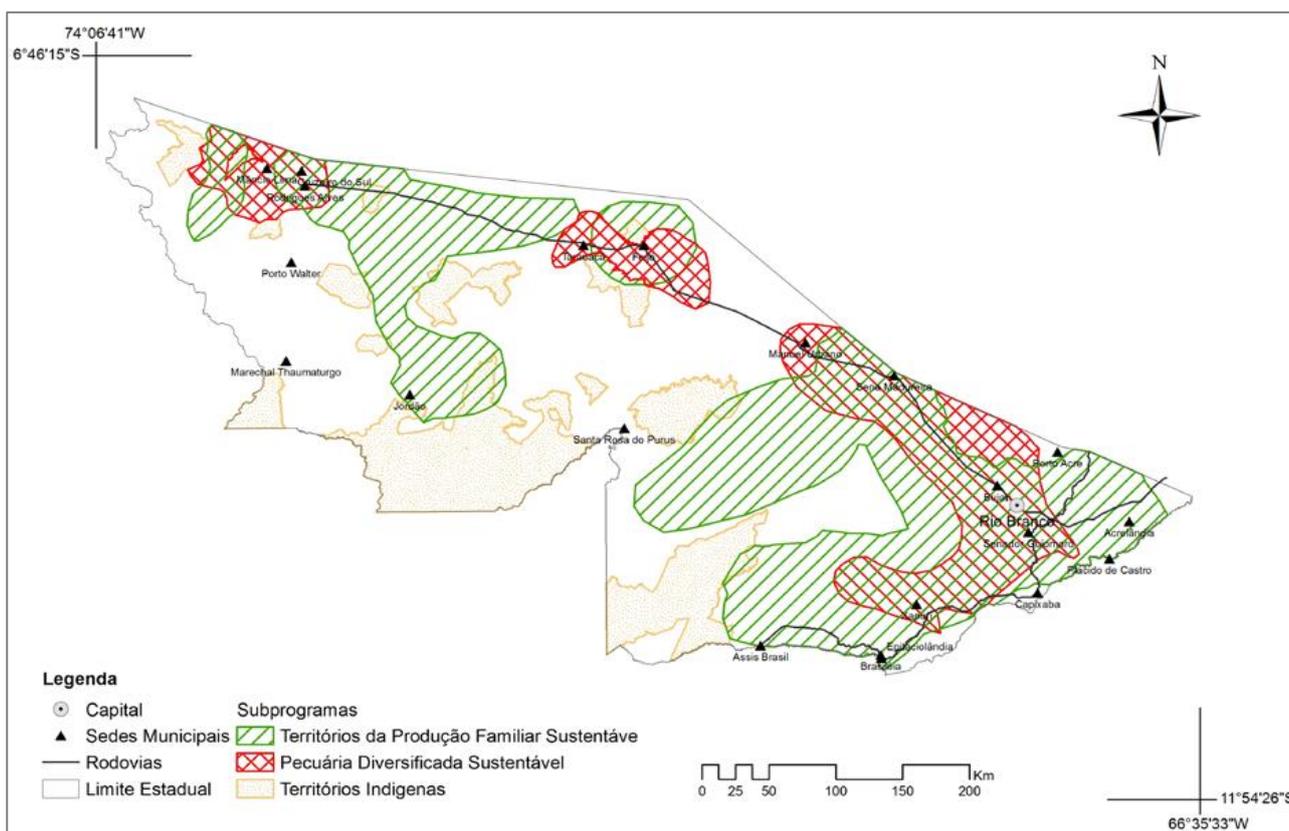

## 1.2 Desafios identificados na implementação do Programa e estratégias de superação adotadas

Após a reestruturação do Programa, que visou ajustes nos Projetos do REM em 2022, respondendo aos desafios identificados pela Avaliação de Meio Termo, um novo momento do Programa se deu a partir da Missão dos Doadores, em julho de 2023, quando houve a pactuação sobre a revisão do modo de desembolso na nova etapa do REM. Como o desmatamento no Estado do Acre tinha subido no período 2018 a 2022, ultrapassando o nível de referência, ou seja, o “gatilho” de performance de 330 km<sup>2</sup> do REM, os pagamentos previstos referentes às reduções de emissões nos anos 2017/2018 e 2018/2019 não se materializaram.

Neste contexto, foi negociada e formalizada a “Proposta para revisão do modo de desembolso do REM Acre Fase II”, encaminhada pelo KfW em 07/06/2023. Esta proposta se baseou nos seguintes pressupostos:

- O aumento do índice de desmatamento no Estado do Acre no período 2018 a 2022, desviando-se do padrão histórico utilizado na avaliação inicial do projeto;
- A necessidade de viabilizar o desembolso dos recursos remanescentes da Alemanha (2,5 milhões de euros) e do Reino Unido (7,35 milhões de libras esterlinas) para garantir o bom desempenho do projeto;
- A contribuição financeira é concedida referente aos pagamentos por resultados de Redução de Emissões (“RE”) nos anos florestais 2015 até 2017 (contribuição da Alemanha) e 2015 até 2019 (contribuição do Reino Unido). Sendo assim, o período total de remuneração do projeto abrange os anos de 2015 a 2019;
- Os pagamentos previstos para os anos 2017/2018 e 2018/2019 não se materializaram por infringir o Artigo 1.7 do Acordo em Separado, que determina que o Programa REM não premiará resultados no ano em que a taxa de desmatamento exceda os 330 km<sup>2</sup> no estado de Acre, correspondente à média histórica de doze anos (2004 a 2015) (gatilho de performance).

A proposta foi apresentada aos governos da Alemanha e do Reino Unido e recebeu a anuência dos respectivos Ministérios, BMZ e DESNZ (BEIS). Os seguintes cenários estavam previstos:

- De acordo com o registro no Info Hub Brasil, o Estado do Acre ainda dispõe de RE para o ano florestal de 2016/2017 no valor de 7.002.750 M tCO<sub>2</sub>e. Estas RE são verificadas pela CONAREDD+ e a UNFCCC e disponíveis para captação pelo Estado do Acre;
- Desse total de 7.002.750 M tCO<sub>2</sub>e, é preciso subtrair o último pagamento do BEIS de 857.600 M tCO<sub>2</sub>e de 12/08/2021, que ainda não foi registrado no Info Hub Brasil;
- Portanto, o Estado do Acre ainda dispõe de 6.145.150 M tCO<sub>2</sub>e para o ano florestal 2016/2017, último ano em que a taxa de desmatamento ficou abaixo do gatilho de 330 km<sup>2</sup>. Apesar de se tratar de RE passadas (“vintage”), essas RE estão dentro do período de remuneração do projeto (2015-2019) e, portanto, podem ser remuneradas.


Portanto, o KFW propôs que o programa premie estas RE 2016/2017 com os recursos remanescentes das contribuições financeiras (aproximadamente 10,9 milhões de euros).

Por se tratar de RE “vintage”, a contribuição própria do Estado do Acre para gestão de riscos será aumentada e ficará na proporção de uma tonelada e meia aposentada para cada tonelada paga. Sendo assim, para o total de RE remuneradas de 2,37 M tCO<sub>2</sub>e serão descontadas 3,57 M tCO<sub>2</sub>e adicionais do limite de captação atribuído ao Estado do Acre e inseridos no Info Hub Brasil. Para efeitos de gestão de riscos podem ser consideradas RE dos anos 2015/16 e 2016/17. O valor total de RE descontadas ficará em aproximadamente 5.940.000 M tCO<sub>2</sub>e, o que está dentro do limite de captação do Estado do Acre para o período 2015 a 2017.

Para cada desembolso foram acordadas as seguintes **condições de pagamento** (“gatilhos de pagamento”), que deverão ser cumpridos pelo Estado do Acre:

- ▶ O primeiro desembolso de 1,5 M EUR + 4,4 M GBP em 2023 será efetivado após a publicação do **Decreto** que institui o **PPCDQ-AC 2023-2027**.
- ▶ O segundo desembolso de 1,0 M EUR + 2,9 M GBP será efetivado no final de 2024, sob a condição de o desmatamento no estado estar dentro do **limite de 678 km<sup>2</sup>**, previsto para o ano de 2024, ou 20% abaixo do nível de 2022, o que demonstrará que o estado está no caminho certo, para conseguir chegar abaixo de 319 km<sup>2</sup> de desmatamento em 2027 (**Figura 2**). Caso o estado não consiga baixar o desmatamento para o nível de 678 km<sup>2</sup> em 2024, o valor do desembolso será proporcional ao desempenho conseguido.


**Figura 2: Metas de redução do desmatamento previstas no PPCDQ-AC**

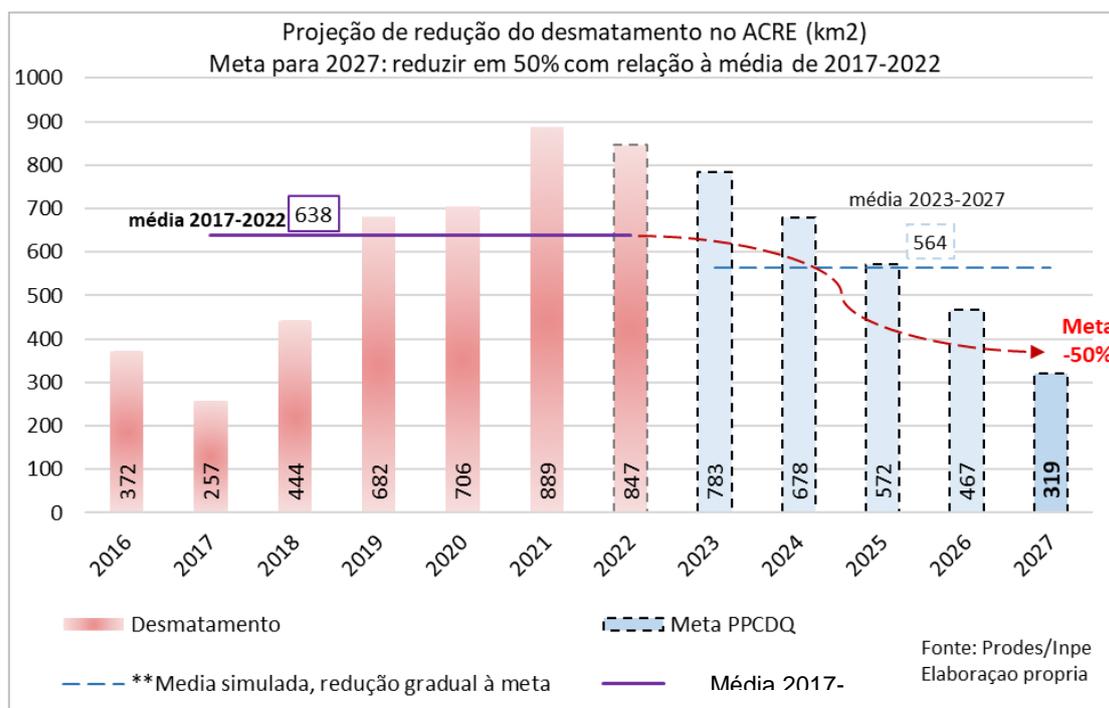

Os representantes do Estado do Acre aceitaram a proposta e concordaram com as condições acima definidas, que foram inseridas na nova versão do Acordo em Separado.

A exigência para o primeiro desembolso foi cumprida com a publicação do PPCDQ-AC 2023-2027, em novembro de 2023 (Decreto 11.372/2023). Já a segunda condicionante, de chegar a uma taxa de desmatamento de no máximo 678 km<sup>2</sup> em 2024, conseguiu ser alcançada logo em 2023, com a retomada do combate ao desmatamento na Amazônia a nível federal e uma maior integração entre os órgãos federais e estaduais nas operações de comando e controle, reduzindo o desmatamento no Acre em 29% entre 2022 e 2023, chegando assim a 601 km<sup>2</sup>, valor bem menor do que o projetado no âmbito do PPCDQ para 2024, como mostra a **Figura 3**.

**Figura 3: Taxas de desmatamento no Acre 1988 - 2023 (km<sup>2</sup>)**

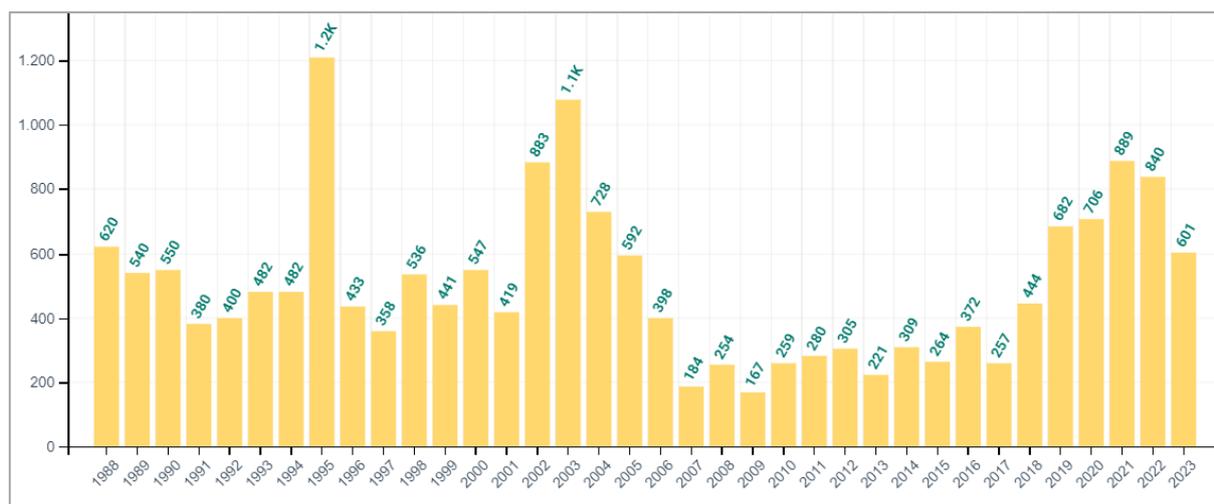

Fonte: INPE/PRODES, Plataforma TerraBrasilis (Dados consolidados e atualizados em 06/05/2024)

### 1.3 Elaboração e formalização do Plano Estadual de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Queimadas do Acre – PPCDQ-AC

Em novembro de 2023 foi finalizado o processo de construção e formalização do Plano Estadual de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Queimadas do Acre – PPCDQ-AC 2023-2027.

Após aprovação pelos dois Conselhos, o Conselho Estadual de Meio Ambiente e Florestas – CEMAF, em 31/10/2023, e o Conselho de Desenvolvimento Rural e Florestal Sustentável – CDRFS, em 21/11/2023, o PPCDQ-AC 2023-2027 foi finalmente instituído com a publicação do Decreto 11.372, de 28/11/2023, assinado pelo Governador do Estado do Acre. Dessa maneira, foi cumprida a condicionante dos Doadores para a liberação do penúltimo desembolso, no valor total de 6,6 M EUR (cerca de 35,6 M R\$, pelo câmbio atual).

Com isso se encerrou o processo que começou em julho de 2022, no qual a CI e a UCP-REM/SEPLAN desempenharam um papel técnico e aglutinador relevante na construção participativa com todas as instituições envolvidas assim como na redação e diagramação do Plano, contando ainda com o auxílio da GIZ / Emboé Consultoria na montagem metodológica e no alinhamento com o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAm (**Figura 4**).

Figura 4: Cronograma de construção do novo PPCDQ-AC 2023-2027

Atividades segundo o Plano de Trabalho do Consultor	
Alinhamento com a SEMAPI, UCP-REM/SEPLAG, Consultoria Internacional e elaboração do <b>Produto 1 - Plano de Trabalho</b> (07-10/06/2022) Aprovação do Plano de Trabalho (25/07/2022)	✓
<b>Atividade 1</b> - Reuniões institucionais – nível de comando (08/2022)	✓
<b>Atividade 2</b> - Reuniões institucionais – nível operacional (08/2022)	✓
<b>Atividade 3</b> - Abordagem municipal: Análise dos documentos e dados e decisão, junto com a SEMAPI, de não incluir os planos municipais nesta fase (08 – 09/2022)	✓
<b>Atividade 4</b> - Reconhecimento e compilações documentais (08 – 09/2022)	✓
<b>Atividade 5</b> - Recomposição do CGI (08/2022)	✓
<b>Atividade 6</b> - Elaboração do Modelo de Resultados para cada Eixo do Plano, Mapa de Atores e Estrutura de Governança do Plano → 1ª Oficina participativa com os membros do CGI, apoiada pela GIZ / Emboé (12-16/09/2022)	✓
<b>Atividade 7</b> - Validação do Modelo de Resultados e Mapa de Atores; Elaboração do Quadro Lógico do Plano → 2ª Oficina participativa com o CGI, apoiada pela GIZ / Emboé (24-26/10/2022)	✓
<b>Atividade 8</b> - Elaboração do Plano de Monitoramento do PPCDQ-AC, da Análise de Capacidade e da Análise de Riscos. → 3ª Oficina participativa com o CGI, apoiada pela GIZ / Emboé (06-08/12/2022)	✓
<b>Atividade 9</b> - Proposição de Ações por Eixo do PPCDQ-AC. <b>Nova Atividade</b> proposta pelo Consultor: Elaboração de um <b>4º Eixo</b> (transversal): “Governança, Monitoramento das Ações e Sustentabilidade Financeira”. <b>Nova Atividade:</b> proposta de POA para as ações do Plano.	✓
<b>Atividade 10</b> - Validação de Ações por Eixo do PPCDQ-AC. → 4ª Oficina participativa com o CGI, apoiada pela GIZ / Emboé (01-02/03/2023)	
<b>Entrega do Produto 2: Esboço preliminar do PPCDQ-AC</b> (06/03/2023)	✓
Análise e aprovação por parte da Consultoria Internacional (Contratante), SEMAPI e UCP-REM/SEPLAN. Sugestões a serem incorporadas no Produto final por parte da Consultoria Internacional e SEPLAN (15/03/2023)	✓
<b>Entrega do Produto 3: Versão final, consolidada do PPCDQ-AC</b> (27/03/2023)	✓
Análise e sugestões por parte da SEMAPI (08/05/2023)	✓
<b>Produto Final Consolidado</b> com inclusão das sugestões e diagramação (19/06/2023)	✓
Ajustes e inclusão de considerações ao Produto Final Consolidado (SEMAPI e UCP-REM/SEPLAN) (24/08/2023)	✓
<b>Etapas de Formalização do PPCDQ-AC</b>	
Publicação e divulgação do Plano para Consulta Pública de 31/08 a 14/09/2023	✓
Validação pelo Comitê Gestor de Mudanças Climáticas do Estado - CGMC (02/10/2023)	✓
Análise das sugestões da <b>Consulta Pública</b> , incorporação e última revisão do Plano pela SEMA, UCP-REM e CI (03/10/2023)	✓
Aprovação pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente e Florestas - CEMAF (31/10/2023)	✓
Aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Rural e Florestal Sustentável – CDRFS (21/11/2023)	✓
<b>Publicação do Decreto 11.372, de 28/11/2023, que institui o PPCDQ-AC 2023-2027</b>	✓

As oficinas participativas, apoiadas pela GIZ / Emboé, a CI e a UCP/REM contaram com a participação maciça, nas análises e na tomada de decisões, do Comitê Gestor Interinstitucional (CGI) do PPCDQ/AC, constituído através da Portaria SEMAPI Nº 169 (10/08/2022) e composto por 36 instituições. Desta maneira, a SEMAPI, UCP-REM/SEPLAN, CI e GIZ trabalharam de maneira integrada e bastante coesa na construção do novo PPCDQ/AC 2023 - 2027.

Também houve um alinhamento do Plano com iniciativas regionais e nacionais, como o Programa Regional de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas na Amazônia, elaborado no âmbito do Consórcio Amazônia Legal, que reúne os estados da região, e o novo PPCDAM, que começou a ser delineado no início de 2023 no âmbito do novo governo federal.

## 1.4 Análise e avaliação dos projetos para definição do novo Plano de Investimentos – PDI 2024-2026

Dando continuidade ao trabalho de levantamento e análise dos dados de monitoramento dos projetos do REM, iniciada junto à equipe de monitoramento da UCP-REM em janeiro de 2024, a Consultoria Internacional elaborou uma metodologia para a definição e o planejamento dos projetos a serem desenvolvidos até o final da Fase II (2024-2026), com base nos últimos dois desembolsos dos doadores, totalizando cerca de 11 milhões de Euros, equivalentes a cerca de 59 milhões de Reais (dependendo da taxa de câmbio). A metodologia previa três passos:

- uma **Avaliação do Desempenho** de cada projeto (atividades, metas, gasto de recursos);
- uma **Avaliação da Conformidade com os Critérios do REM** (eficiência contra o desmatamento, emissões de CO<sub>2</sub> etc.) de cada projeto;
- e, com base nestas avaliações, a **Tomada de Decisão**, identificando os projetos que serão continuados, os que serão continuados com correções, os que serão descontinuados assim como eventuais novos projetos.

Este procedimento embasou o desenho de um portfólio de 26 Projetos com suas metas, além de um Fundo Emergencial para Eventos Extremos, assim como a definição do Plano de Investimentos - PDI para 2024-2026, como demonstrado na **Figura 6**, que apresenta de forma resumida o alcance das metas até junho de 2024 assim como as novas metas dos projetos que integram o novo Plano de Investimentos – PDI 2024-2026.

A avaliação mais detalhada das atividades, metas e da execução financeira por projeto e executora será apresentada no **Capítulo 3**.

Figura 5: Alcance das metas e novas metas para o novo PDI 2024-2026

SUB-PROGRAMA	PROJETOS	Metas da Fase II	Alcançado 06/2024	Metas para o novo PDI 2024 - 2026
Territórios Indígenas	Agentes Agroflorestais Indígenas - AAFIs	<b>117 AAFIs</b> em atividade e com bolsas concedidas	<b>145 AAFIs</b>	<b>145 AAFIs</b> continuam suas atividades e recebem as bolsas todo ano
	Formação e Capacitação de AAFIs	<b>4 cursos</b> de formação para 30 agentes por curso (Total: <b>120</b> )	<b>3 cursos (90 AAFIs)</b>	<b>1 curso</b> de formação para <b>30 AAFIs</b>
	Implementação dos PGTIs	<b>40 projetos</b> indígenas implementados (Será beneficiada toda a população das TIs alcançadas pelos editais)	<b>29 projetos</b>	<b>10 novos projetos indígenas</b> implementados no âmbito de <b>1 novo edital</b>
	Formação Intercultural Diferenciada Indígena	<b>132 escolas indígenas</b> com currículos específicos implementados e voltados à gestão etnoambiental e territorial <b>1.500</b> alunos e professores beneficiados.	<b>150 escolas indígenas com 1.908 alunos e professores</b> beneficiados.	<b>14 oficinas</b> de processos formativos articulados entre docentes indígenas e agentes agroflorestais nas TIs do Acre
Territórios da Produção Familiar Sustentável	Cadeia Prod. do látex nativo ( <i>Projeto incorporado à cadeia da borracha</i> )			
	Cadeia Prod. da Borracha	<b>700 produtores</b> extrativistas recebendo subsídios da borracha (500 SEAGRI + 200 FUNTAC)	<b>650 produtores com pagamentos pendentes!!!</b>	<b>750 produtores</b> extrativistas recebendo subsídios da borracha
	Cadeia Prod. da Castanha	<b>360 produtores</b> extrativistas capacitados em BPP e manejo da castanha	<b>353 produtores</b>	-
	Cadeia Prod. do Murmuru	<b>216 produtores</b> extrativistas recebendo subsídio do Murmuru	<b>211 produtores</b>	<b>211 produtores</b> extrativistas continuam suas atividades, recebendo subsídio incrementado (3 x mais)
	Cadeia Prod. do Mel	<b>200 produtores</b> capacitados e beneficiados	<b>372 produtores</b>	<b>20 novos produtores</b> capacitados e beneficiados; <b>1 Casa de Mel</b> implementada na fazenda (equipamentos, procurando selo ANVISA ou outros)
	Cadeias Prod. Cacau Nativo	<b>80 produtores</b> capacitados e realizando a comercialização	<b>38 produtores</b>	<b>2 cursos de BPP;</b> <b>Controle biológico da monilíase em cacauero;</b> <b>1 Pesquisa</b> sobre produção de mudas de cacau com substratos alternativos à base de torta de Murmuru
	Cadeia Prod. dos Óleos Vegetais	<b>300 produtores</b> extrativistas capacitados e realizando a comercialização; <b>5 unidades de beneficiamento</b> de óleos vegetais produzindo	<b>200 produtores;</b> <b>1 unidade de beneficiamento</b>	<b>500 novos produtores</b> capacitados e beneficiados no âmbito dos <b>4 Termos de Fomento;</b> <b>5 unidades de beneficiamento</b> de óleos vegetais produzindo (4 pelo edital e 1 por execução direta).

	Gestão das UGAIs	<b>4 UGAIs</b> em funcionamento, atendendo as famílias das 5 FEs	<i>em análise</i>	<b>4 UGAIs</b> em funcionamento, atendendo <b>100 famílias</b> das UCs (Apoio à manutenção das UGAIs em complementariedade às ações do Fundo Amazônia); <b>200 famílias</b> beneficiadas no âmbito de <b>1 edital para Premiação de Boas Práticas</b> na valoração econômica dos produtos florestais não madeireiros, para produtores das UCs
	Sistemas Agroflorestais - SAFs	<b>3.100 ha</b> de área degradada recuperados com SAFs (100 ha com plantio de abacaxi e 3.000 ha com mandioca) <b>120 produtores beneficiados</b> <b>350 produtores capacitados</b>	<b>694 ha</b> recuperados <b>134 produtores</b> beneficiados	<b>350 produtores</b> beneficiados com a mecanização, para recuperação da área degradada com o plantio de mandioca
	Programa de Regularização Ambiental - PRA	<b>220 ha</b> de passivo florestal com sistemas agroflorestais implantados; <b>303 produtores</b> beneficiados; <b>1.000 mudas</b> produzidas por ano; <b>17 Relatórios / mês</b> (17 Consultores)	<i>em análise</i>	-
	Turismo de Base Comunitária	<b>4 Planos de Turismo Comunitário (PTC)</b> elaborados; <b>155 pessoas beneficiadas</b> com a implementação dos planos; <b>60 pessoas formadas</b> em cursos de gastronomia regional	<b>5 PTCs</b> elaborados; <b>397 pessoas</b> beneficiadas; <b>47 pessoas</b> formadas em gastronomia regional	<b>50 produtores beneficiados</b> com a implementação do PTC na Serra do Divisor <b>2 Planos</b> divulgados (redes e impressão gráfica) <b>50 produtores participando do</b> Encontro Trinacional de Gastronomia (Madre de Dios, Acre Pando - MAP)
	Design em Produtos Madeireiros	<b>25 artesãos</b> com design de seus produtos melhorados	<b>25 artesãos</b>	-
	Artesanato Florestal	<b>72 artesãos</b> comercializando seus produtos em feiras	<b>67 artesãos</b>	-
	Plano Emergencial			-
<b>Pecuária Diversificada Sustentável</b>	Cadeia Prod. Bovinocultura	<b>2.000 ha</b> recuperados; <b>200 produtores</b> apoiados; <b>15 unidades demonstrativas</b> implementadas	<b>2.012 ha</b> recuperados <b>325 produtores;</b> <b>18 unidades dem.</b> implementadas	<b>1.150 ha</b> recuperados (230 produtores x 5 ha); <b>230 produtores</b> apoiados com distribuição de 1.150 t de calcário dolomítico e 550 t de ureia e apoio técnico

	Cadeia Prod. da Galinha Caipira	<p><b>1 central de incubação</b> construída (capacidade: 150.000 pintos / ano);</p> <p><b>20 unidades demonstrativas</b> implementadas;</p> <p><b>500 produtores</b> apoiados com a doação de pintos;</p> <p><b>1.200 agricultores</b> beneficiados / ano com a aquisição de pintos produzidos na central de incubação</p>	0	<p><b>1 central de incubação</b> construída (capacidade: 150.000 pintos / ano);</p> <p><b>20 unidades demonstrativas</b> implementadas;</p> <p><b>500 produtores</b> apoiados com a doação de pintos;</p> <p><b>1.200 agricultores</b> beneficiados / ano com a aquisição de pintos produzidos na central de incubação</p>
	Sistema de Energia Solar	<p><b>8 sistemas solares</b> instalados (8 produtores beneficiados)</p>	<p><b>10 sistemas solares</b> instalados</p>	<p><b>20 sistemas solares</b> instalados em propriedades leiteiras, beneficiando <b>20 pequenos produtores</b></p>
Mecanismos de REDD+	Monitoramento e MRV	<p><b>SEMA:</b>  <b>1 NT mensal e 1 Relatório Anual</b> com a análise de desmatamento, queimadas e degradação amb. no estado.</p> <p><b>IMC:</b>  <b>1 Sistema MRV do Acre</b> atualizado e alinhado ao sistema nacional (FREL estadual e nacional)</p> <p><b>1 Plano MEL</b> do Programa REM implementado</p> <p><b>1 Plataforma de Monitoramento</b> do Programa REM implantada e operante</p>	<p><b>1 NT mensal</b>  <b>Faltam os Relatórios Anuais de 2022 e 2023</b></p> <p><b>1 Sistema MRV</b> atualizado e alinhado</p> <p><b>1 Plano MEL</b> do REM implementado</p> <p><b>1 Plataforma de Monitoramento em finalização</b></p>	<p><b>SEMA:</b>  <b>1 NT mensal e 1 Relatório Anual</b> com a análise de desmatamento, queimadas e degradação amb. no estado.</p>
	Comunicação do SISA	<p><b>1 Plano de Comunicação</b> elaborado e implementado</p> <p><b>1 Site institucional do Programa</b> implementado e ativo</p> <p><b>24 matérias veiculadas / ano</b> sobre as ações do Programa</p> <p><b>2.000 pessoas/ano</b> alcançadas pelas redes sociais</p>	<p><b>1 Plano de Comunicação</b></p> <p><b>1 Site</b> implementado e ativo</p> <p><b>79 matérias / ano</b></p> <p><b>10.000 pessoas/ano</b> alcançadas</p>	<p><b>1 Site</b> atualizado e alinhado com as Metas do REM e a Plataforma de Monitoramento</p> <p><b>80 matérias / ano sobre o REM</b></p> <p><b>10.000 pessoas/ano</b> alcançadas pelas redes sociais</p>
	Governança, Salvaguardas e Transparência do SISA	<p><b>30 Membros</b> capacitados e participando ativamente da implementação do Programa REM e do SISA através da CEVA, CTPI e CTM e instituições implementadoras</p> <p><b>6 Treinamentos e capacitações</b> por ano para grupos-alvo e implementadores para disseminação e aprimoramento do SISA</p>	<p><b>30 membros</b> capacitados e participando</p> <p><b>6 treinamentos e capacitações / ano</b></p>	<p><b>30 Membros</b> capacitados e participando ativamente da implementação do Programa REM e do SISA através da CEVA, CTPI e CTM e instituições implementadoras</p> <p><b>CTJ instalada, capacitada e funcionando</b></p> <p><b>6 Treinamentos e capacitações</b> por ano para grupos-alvo e implementadores para disseminação e aprimoramento do SISA</p>

		<p><b>1 Manual de Salvaguardas</b> revisado e</p> <p><b>1 Plano de Ação</b> elaborado por ano</p>		<p><b>1 Manual de Salvaguardas</b> revisado e</p> <p><b>1 Plano de Ação</b> elaborado por ano</p>
	Unidade Gestora do SISA - IMC	<p><b>2 Sistemas Subnacionais de REDD+</b> alinhados com os Sistemas Nacionais, no âmbito da <b>contabilidade de carbono e salvaguardas</b></p> <p><b>1 Proposta de nível de referência e aninhamento</b> dos projetos privados de REDD+ no âmbito do SISA</p> <p><b>2 novos Programas do SISA</b> elaborados com minutas de Lei</p>	<p><b>1 Sistema Subnacional de contabilidade de carbono</b> alinhado com o Sis. Nacional</p> <p><b>1 Proposta de nível de referência e aninhamento</b></p>	<p><b>1 Sistema Subnacional de Salvaguardas do SISA</b> alinhado com o Sistema Nacional</p> <p><b>1 Proposta de alinhamento do Programa Jurisdicional de REDD+ do Acre com o Sistema Nacional</b></p>
	Geração e Gestão do Conhecimento	<p><b>6 Estudos</b> elaborados, que contribuem com a análise e o aprimoramento do SISA, sendo:</p> <p><b>SEMA:</b></p> <p><b>1 Revisão do ZEE – Fase III;</b></p> <p><b>1 Atualização do PPCDQ-AC;</b></p> <p><b>IMC:</b></p> <p><b>1 Inventário de GEE do Acre;</b></p> <p><b>1 Análise de possíveis vazamentos</b> do Prog. ISA Carbono a nível jurisdicional;</p> <p><b>1 Estudo</b> analisando a contribuição de reduções de carbono nos territórios beneficiados pelo Programa REM Acre;</p> <p><b>1 Estudo</b> analítico das políticas públicas no estado do Acre, nos últimos 10 anos.</p>	<p><b>4 Estudos:</b></p> <p><b>SEMA:</b></p> <p><b>1 Revisão do ZEE – Fase III;</b></p> <p><b>1 Atualização do PPCDQ-AC;</b></p> <p><b>IMC:</b></p> <p><b>1 Análise de vazamentos</b></p> <p><b>1 Estudo</b> analisando a contribuição de reduções de carbono nos territórios beneficiados pelo Programa REM Acre;</p>	<p><b>2 Estudos do IMC:</b></p> <p><b>1 Inventário de GEE do Acre;</b></p> <p><b>1 Estudo analítico das políticas públicas no estado do Acre nos últimos 10 anos.</b></p>
	Ouvidoria do SISA	<p><b>16 Manifestações</b> recepcionadas pela Ouvidoria (4 manifestações por cada subprograma e componente 4) que foram devidamente consideradas e endereçadas</p> <p><b>25 Eventos de difusão</b> promovendo a Ouvidoria do SISA e o Programa REM Acre Fase 2 (Ouvidoria Itinerante)</p>		<p><b>1 Manual de atendimento</b> com fluxos, prazos etc.</p> <p><b>Relatórios trimestrais</b> contendo registro de manifestações por tipo e setor</p>

<b>Fortalecimento do SISA</b>	Gestão de Ativos, Projetos Especiais e Sustentabilidade Financeira - CDSA	<p><b>4 Instrumentos de parceria</b> (<i>Memorandum of Understanding - MoU</i>) contratual entabulando / efetivando negociações</p> <p><b>1 Processo legal para gestão, registro e certificação</b> estabelecido</p>	<p><b>4 Instrumentos –(MoU)</b></p> <p><b>1 Processo legal para gestão, registro e certificação</b></p>	<p><b>2 Instrumentos de parceria</b> (<i>Memorandum of Understanding - MoU</i>) contratual entabulando / efetivando negociações de capitalização do SISA</p> <p><b>1 Projeto elaborado</b></p>
	Comando e Controle	<p><b>BPA, IMAC, SEMA:</b> <b>48 Ações integradas de comando e controle / ano</b> no combate ao desmatamento, a incêndios florestais e à degradação florestal</p> <p><b>BPA, CBMAC, SEMA:</b> <b>5.000 Pessoas</b> sensibilizadas e / ou capacitadas em ações de combate ao desmatamento, queimadas crimes ambientais e outros ilícitos, conservação e educação ambiental</p> <p><b>CIOPAER:</b> <b>5 Sobrevoos / ano</b>, sendo 4 para o atendimento dos órgãos estaduais e 1 para o atendimento dos órgãos federais</p> <p><b>IMAC:</b> <b>200 Autos de infração por ano</b> lavrados e tratados</p>	<p><b>65 Ações integradas / 2023</b></p> <p><b>3.000 Pessoas</b></p>	<p><b>BPA, IMAC, SEMA:</b> <b>48 Ações integradas de comando e controle / ano</b> no combate ao desmatamento, a incêndios florestais e à degradação florestal – 38 operações com instituições estaduais (BPA e IMAC) e 10 operações com instituições federais (IBAMA e ICMBIO).</p> <p><b>BPA:</b> <b>1.000 Pessoas</b> sensibilizadas e / ou capacitadas em ações de combate ao desmatamento, queimadas crimes ambientais</p>
	Gestão do Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas – SEANP SEMA	<p><b>5 UGAls em funcionamento</b>, para apoiar as capacitações dos moradores das UCs</p> <p><b>200 Moradores</b> das UCs de gestão da SEMAPI capacitados</p>	<i>em análise</i>	<b>200 moradores das 9 UCs de gestão da SEMA capacitados</b>
	Regularização Fundiária - ITERACRE	<p><b>1.362 Propriedades rurais</b> nas regiões do Alto e Baixo Acre com cadastro realizados</p> <p><b>161.659 ha de Terras aptas à regularização fundiária no âmbito da União</b></p>	<p><b>710 Propriedades</b></p> <p><b>100.395 ha</b></p>	-
	Gestão Técnica, Adm. e Financeira do Programa REM – UCP- REM/SEPLAN	<p><b>1 Equipe Técnica</b>, com no mínimo 13 técnicos, contratada, para o funcionamento operacional, administrativo, técnico e financeiro do Programa REM através da UCP implementada</p>		<p><b>1 Equipe técnica</b>, com no mínimo 13 pessoas, contratada, para apoio operacional, administrativo e financeiro do Programa REM</p> <p><b>Auditoria financeira</b> anual contratada;</p> <p><b>Auditoria técnica</b> contratada;</p> <p><b>2 Consultores internacionais</b>, para o acompanhamento técnico do Programa, contratados.</p>

## 1.5 Balanço da Ouvidoria

Graças às ações proativas da Ouvidoria, principalmente no âmbito das atividades da “Ouvidoria itinerante”, que acompanhou as ações das executoras do programa em campo, tanto durante o ano de 2023 quanto nos primeiros dois trimestres de 2024, as ações do Programa REM ficaram mais visíveis para os beneficiários, o que levou a um aumento das manifestações para um total de 39, das quais 6 reclamações, 2 denúncias, 9 solicitações, 6 sugestões e 16 elogios, como demonstra a figura a seguir.

**Figura 6: Manifestações para a Ouvidoria (2023 – 2024)**

### Manifestações - 2023

Tipo de Manifestação	Quantidade
Reclamação	06
Denúncia	0
Solicitação	08
Sugestão	03
Elogio	0
<b>Total de Manifestações</b>	<b>17</b>

### Manifestações - 1º Trimestre 2024

Tipo de Manifestação	Quantidade
Reclamação	0
Denúncia	1
Solicitação	0
Sugestão	0
Elogio	0
<b>Total de Manifestações</b>	<b>1</b>

### Manifestações - 2º Trimestre 2024

Tipo de Manifestação	Quantidade
Reclamação	0
Denúncia	1
Solicitação	1
Sugestão	3
Elogio	16
<b>Total de Manifestações</b>	<b>21</b>

## 1.6 Acompanhamento dos 7 Indicadores de Sucesso da Matriz Lógica

Subsequentemente à reestruturação do Programa REM Acre Fase II, decorrente da Avaliação de Meio Termo realizada através do contrato da Consultoria Internacional em 2022 e implementada pela UCP-REM e demais executoras, ficou mais evidente e melhor esclarecido o marco lógico do Programa, principalmente na sua dimensão aglutinadora dos beneficiários de cada projeto, garantindo que todos os projetos com suas atividades estejam atrelados corretamente às metas e aos resultados intermediários e finais, alimentando assim os indicadores de sucesso. Neste sentido, o esforço neste período foi para estabelecer uma dinâmica mais objetiva e transparente nas ferramentas de planejamento, execução e monitoramento, ampliando a capacidade de alcance dos objetivos superiores do Programa.

A partir dessa lógica estabelecida foram criados os instrumentos para registro de todas as atividades desenvolvidas pelos projetos e o monitoramento dos resultados intermediários, a partir dos produtos que são apresentados em cada pedido de liberação financeira, bem como sua conexão ao resultado final. Desta maneira, foi possível consolidar os resultados dos 7 indicadores de impacto do Programa (**Figura 7**). Estes e os demais indicadores estão sendo alimentados e atualizados rotineiramente no Painel de Indicadores na página de entrada do Site do Programa [www.programarem.ac.gov.br](http://www.programarem.ac.gov.br).



**Figura 7: Situação dos 7 Indicadores de Sucesso do Programa em 30/06/2024**



## 2. Tendências do Desmatamento no Estado do Acre e nas propriedades dos Beneficiários do Programa REM

A Nota Técnica “Análise do desmatamento nas propriedades dos beneficiários do REM Acre Fase II”, elaborada pela Consultoria Internacional do REM com o apoio da equipe de monitoramento da Unidade de Coordenação do Programa (UCP-REM/Seplan), demonstrou que os beneficiários do Programa REM Acre Fase II não seguiram nos seus territórios e nas suas propriedades os mesmos padrões de incremento do desmatamento observados no resto do estado do Acre e no conjunto da Amazônia Legal, como mostra a **Figura 8**.

**Figura 8: Tendências antagônicas na comparação entre o desmatamento no estado do Acre e o desmatamento nas propriedades dos beneficiários do Programa REM (2019 - 2022)**

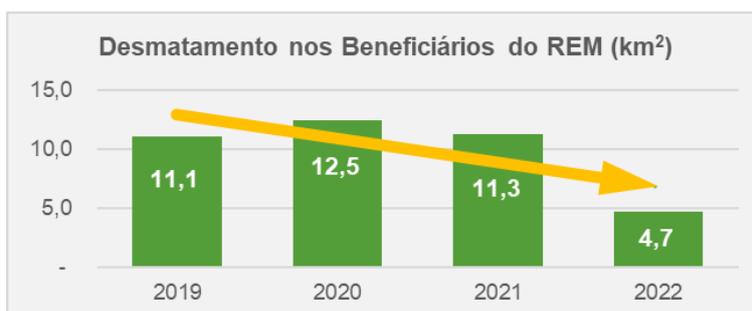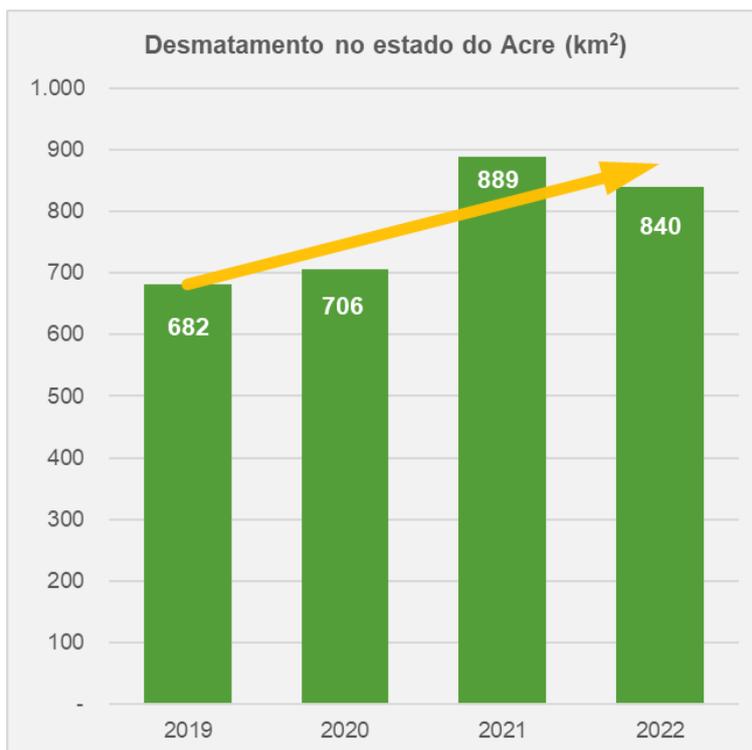

Fonte: INPE/PRODES e análise do desmatamento nos polígonos dos beneficiários do Programa REM Acre Fase II.


A comparação entre as duas dinâmicas de desmatamento evidencia tendências diametralmente opostas. Enquanto a primeira mostra uma tendência (seta amarela) claramente ascendente no estado, a segunda revela uma tendência nitidamente decrescente do desmatamento nas propriedades dos beneficiários do REM.

Estas diferentes dinâmicas das taxas de desmatamento ficam ainda mais antagônicas, se observarmos apenas as mudanças entre os valores de 2019 e 2022. Neste caso, verificamos que enquanto no estado do Acre esta taxa **subiu 23,2%** entre 2019 e 2022, nos polígonos dos 3.110 beneficiários diretos do REM a taxa **diminuiu 57,7%** neste mesmo período, evidenciando tendências totalmente opostas.

Deste modo, ficou comprovada a hipótese que **o Programa conseguiu ter um efeito positivo sobre a conservação da floresta, apesar da tendência geral de aumento do desmatamento.**

Para o propósito da análise, foi realizada primeiro uma amostragem de propriedades de beneficiários, que fazem parte da segunda fase do Programa, sendo que uma parte já vinha se beneficiado desde a primeira fase. Desta maneira, foram identificados 3.110 beneficiários, representando cerca de 39% do total. Estes beneficiários fazem parte dos três subprogramas do REM: Territórios Indígenas, Territórios da Produção Familiar Sustentável e Pecuária Diversificada Sustentável, como mostram as **Figuras 9 e 10**.

**Figura 9: Geolocalização dos Beneficiários do Programa REM Fase II**

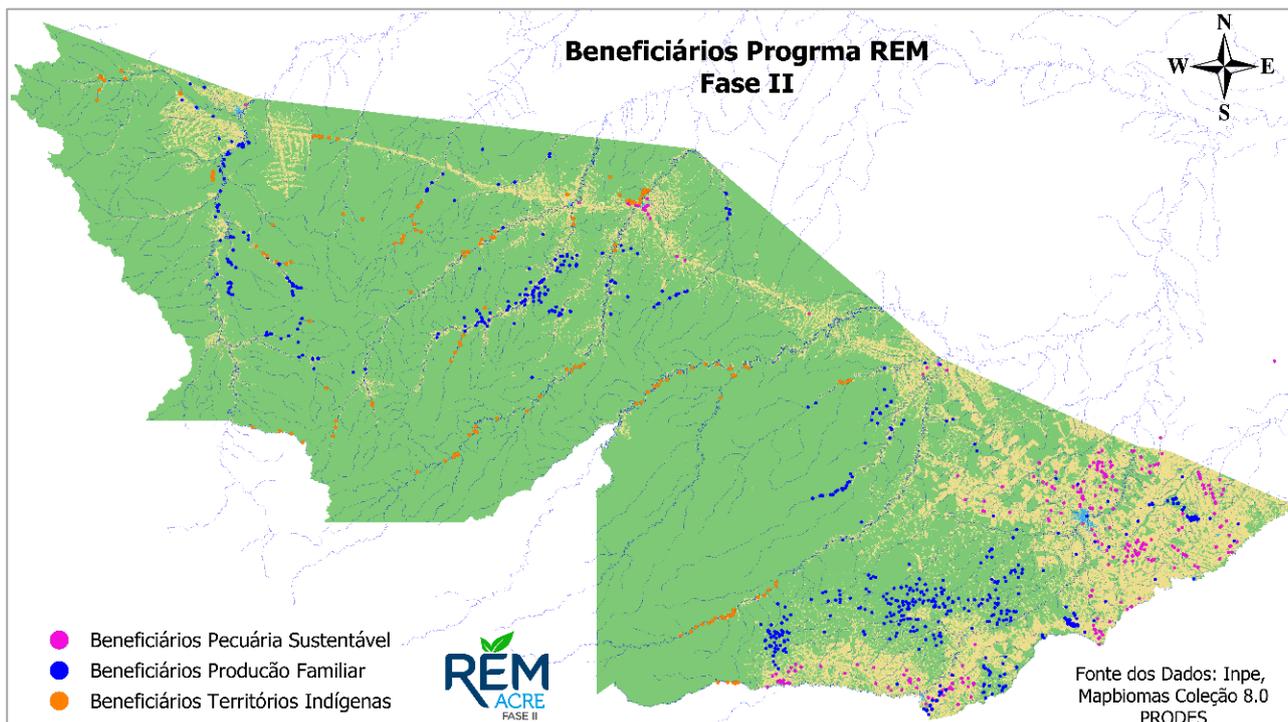

Fontes: Dados de Monitoramento da UCP-REM; INPE/PRODES e MapBiomias.

**Figura 10: Taxa de desmatamento nas propriedades dos beneficiários do Programa REM Fase II (2019 - 2022; Amostragem de 3.110 propriedades)**

Subprograma	Projeto	Nº de beneficiários	Área total das propriedades (ha)	Área desmatada (ha)	% Desmatado
Pecuária Diversificada Sustentável	Cadeia Produtiva da Bovinocultura	18	1.101	26	2,4%
Territórios da Produção Familiar Sustentável	Florestas plantadas em SAFs	199	5.333	138	2,6%
	Subsídios da Borracha e do Mururu	693	61.931	2.150	3,5%
Territórios Indígenas	Agentes Agroflorestais Indígenas	2.200	1.876.505	1.623	0,1%
	Implementação de PGTIs Formação Intercultural Diferenciada Indígena				
<b>Total</b>		<b>3.110</b>	<b>1.944.870</b>	<b>3.937</b>	<b>0,2%</b>

*Fontes: Dados de Monitoramento da UCP-REM; INPE/PRODES e análise do desmatamento nos polígonos dos beneficiários do Programa REM Acre Fase II*

A metodologia utilizada para identificar o desmatamento nas propriedades dos beneficiários se baseia no cruzamento da geolocalização dos polígonos de cada propriedade com uma série de informações e dados geoespaciais, como:

- Dados de desmatamento do Projeto Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE);
- Mapas anuais de cobertura e uso da terra no Brasil do MapBiomas, iniciativa do SEEG/OC (Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima);
- Dados e análises da Unidade Central de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto (UCGEO), da Secretaria de Meio Ambiente do Acre (SEMA);
- Dados georreferenciados fundiários do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA);
- Dados do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR);
- Dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC).

Outro resultado relevante desta análise foi a averiguação da proporção da área desmatada dentro das propriedades dos 3.110 beneficiários do REM. Considerando a extensão total das propriedades (1.944.870 ha), a área desmatada entre 2019 e 2022 (3.937 ha) representa menos de **0,2%** da área total, como indica a **Figura 11**.

**Figura 11: Desmatamento nas propriedades dos beneficiários do Programa REM, considerando todos os Subprogramas (2019 - 2022; em ha e %)**




Fontes: Dados de Monitoramento da UCP-REM; INPE/PRODES e análise do desmatamento nos polígonos dos beneficiários do Programa REM Acre Fase II

No entanto, esta porcentagem baixíssima (0,2%) de desmatamento se deve à inclusão de 2.200 beneficiários indígenas e de suas 23 Terras Indígenas, com uma extensão total de 1.876.505 ha, que representa **96,5%** da extensão total da amostragem e onde se observa apenas **0,1%** de desmatamento no período analisado. Portanto, para evitar um resultado enviesado, foi preciso se debruçar melhor sobre os beneficiários não indígenas e que apresentam práticas produtivas e culturais bem diferentes.

Desta maneira, verificamos que nas propriedades dos 910 beneficiários dos Subprogramas Pecuária Diversificada Sustentável e Produção Familiar Sustentável, com uma área total de 68.365 ha, localizada no arco de desmatamento do estado, portanto, ao contrário das Terras Indígenas, nas áreas mais vulneráveis ao desflorestamento, a taxa de desmatamento para os 4 anos (2019-2022) chega a pouco mais de 3% da área total das propriedades (2.314 ha) (**Figura 12**).

**Figura 12: Desmatamento nas propriedades dos beneficiários do Programa REM, considerando apenas os subprogramas Produção Familiar Sustentável e Pecuária Diversificada Sustentável (2019-2022; ha e %)**

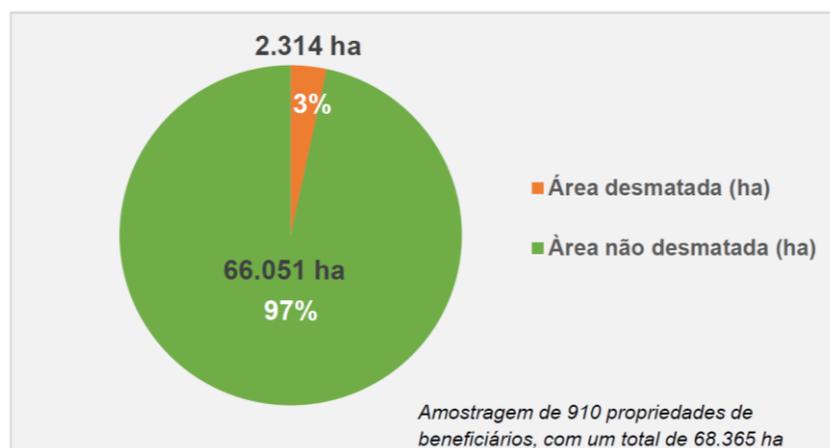


Fontes: Dados de Monitoramento da UCP-REM; INPE/PRODES e análise do desmatamento nos polígonos dos beneficiários do Programa REM Acre Fase II

Isto significa que no período de 2019 a 2022 a **média anual do desmatamento** nas propriedades representou menos de 1% da área, sendo 578 ha/ano (ou 5,8 km<sup>2</sup>/ano). Dividindo o total de área desmatada anualmente pelo número total de beneficiários da amostragem (n=910), a contribuição de cada beneficiário ao desmatamento foi de **0,6 ha/ano** ou (0,006 km<sup>2</sup>/ano), em média.

### 3. Processo de análise e avaliação dos projetos de cada Executora do Programa

A avaliação dos projetos que compõem a Fase 2 do REM Acre visou tanto o desempenho de cada projeto – no que diz respeito à execução das atividades previstas, ao alcance das metas estabelecidas e ao gasto de recursos condizente com o nível de execução – como a conformidade com os critérios do REM, como mostra a Figura a seguir, que apresenta os três passos da metodologia utilizada.

**Figura 13: Metodologia usada para a Avaliação dos Projetos**

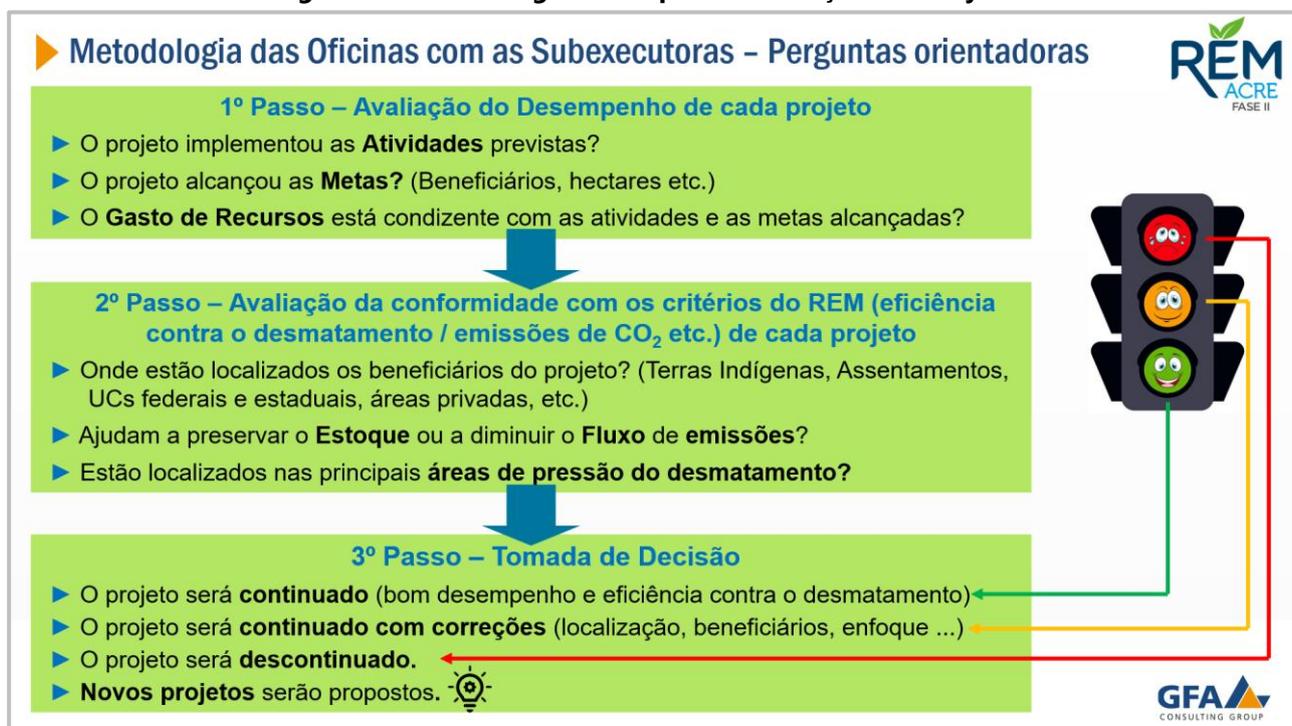


Adicionalmente, empreendeu-se um alinhamento com as linhas de ação de outros grandes projetos com objetivos próximos ou complementares ao REM e financiados por outras fontes, como o Fundo Amazônia / BNDES e o Programa Acre mais Produtivo – PROAMP, para aproveitar ao máximo sinergias entre os diferentes financiamentos e evitar duplicidades de ações.


A seguir serão apresentados os principais resultados deste processo de avaliação por Projeto, Executora e Subprograma.

Olhando o Programa como um todo, podemos observar que, na média, o desempenho dos projetos apresenta níveis bastante coincidentes, no que se refere ao avanço das atividades e das metas assim como ao montante de recursos investidos até o momento e ao saldo ainda disponível (**Figuras 14 e 10**). Entretanto, as diferenças começam a surgir, quando observamos o desempenho por Subprograma (**Figuras 16 e 17**) e, principalmente, por Executora (**Figuras 18 a 33**).


**Figura 14: Resumo do Desempenho do Programa REM**

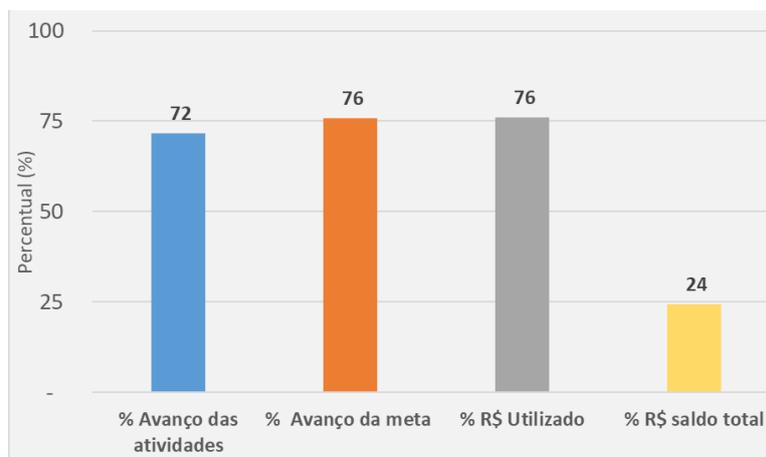


**Figura 15: Desempenho segundo a Repartição de Benefícios (70% x 30%)**

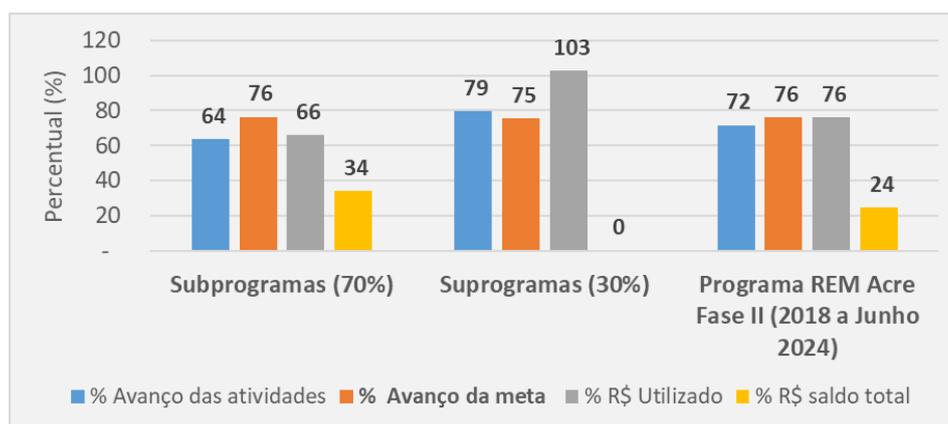


**Figura 16: Desempenho por Subprograma**

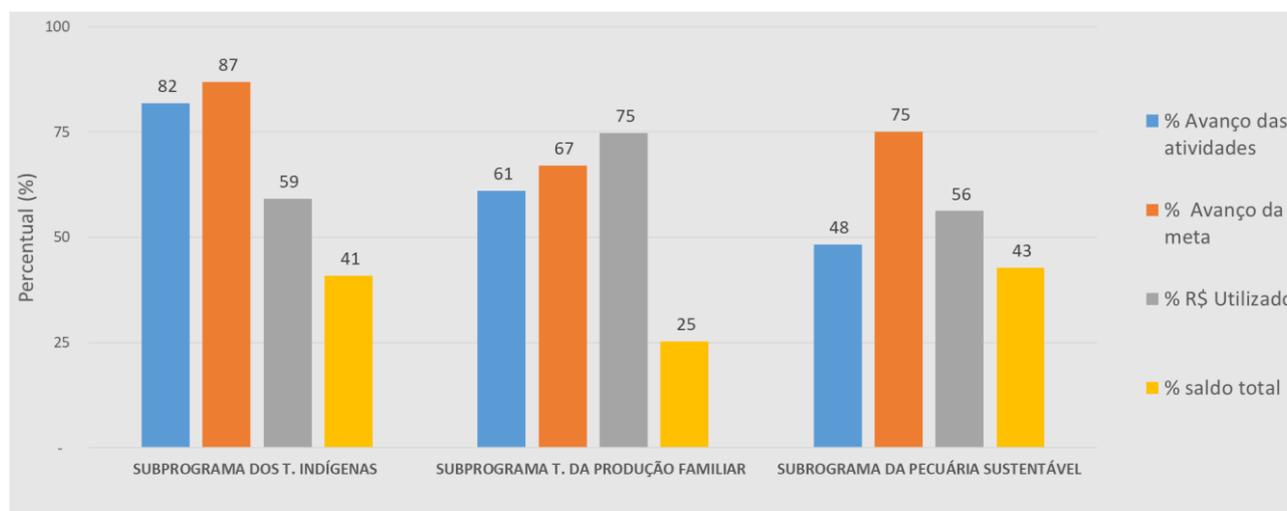


**Figura 17: Desempenho no Componente REDD+ e SISA**

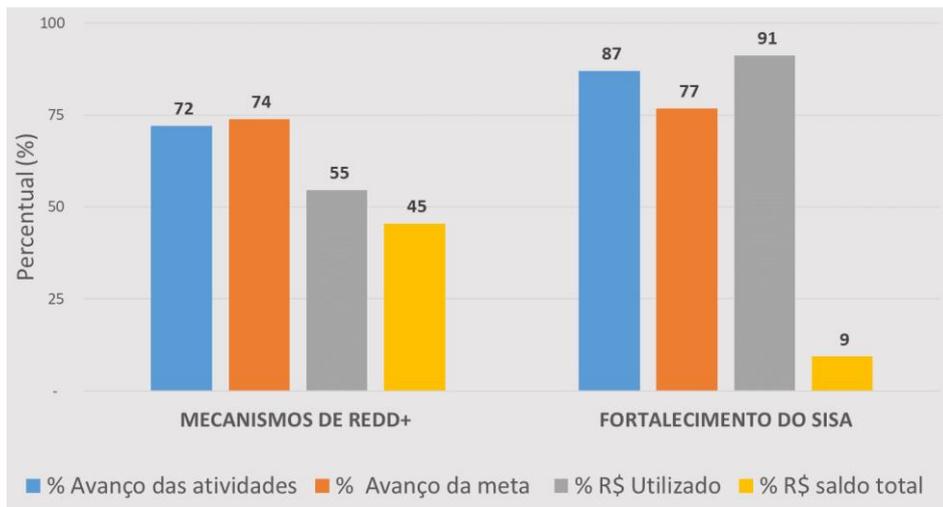


**Figura 18: Desempenho por Executora**

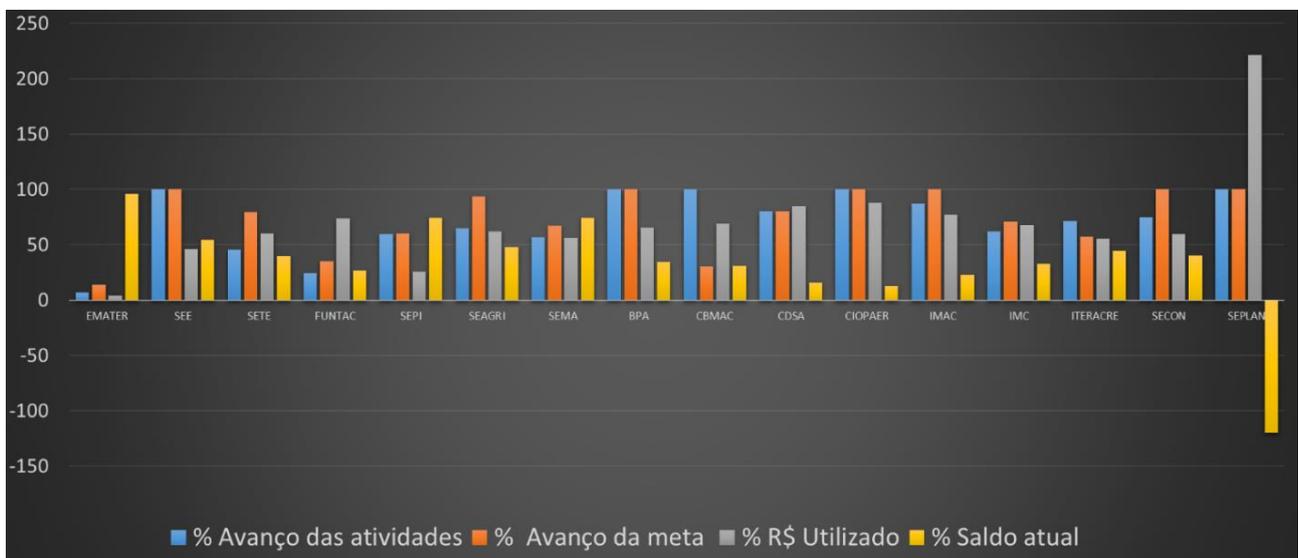


**Figura 19: Execução Financeira por Executora**

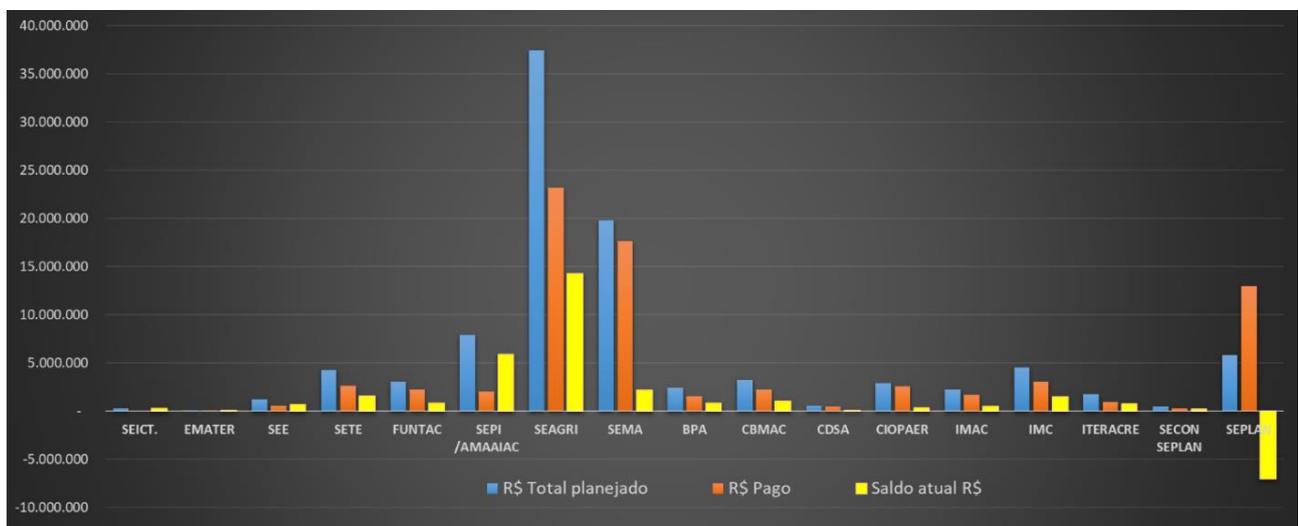


**Figura 20: Desempenho por Executora: SEAGRI**

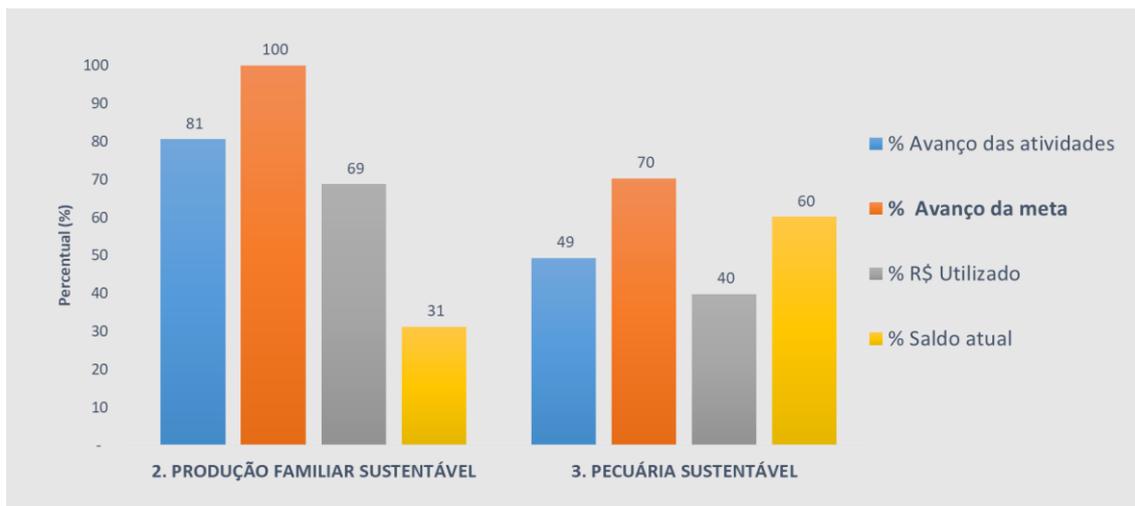


**Figura 21: Desempenho por Executora: SEPI**

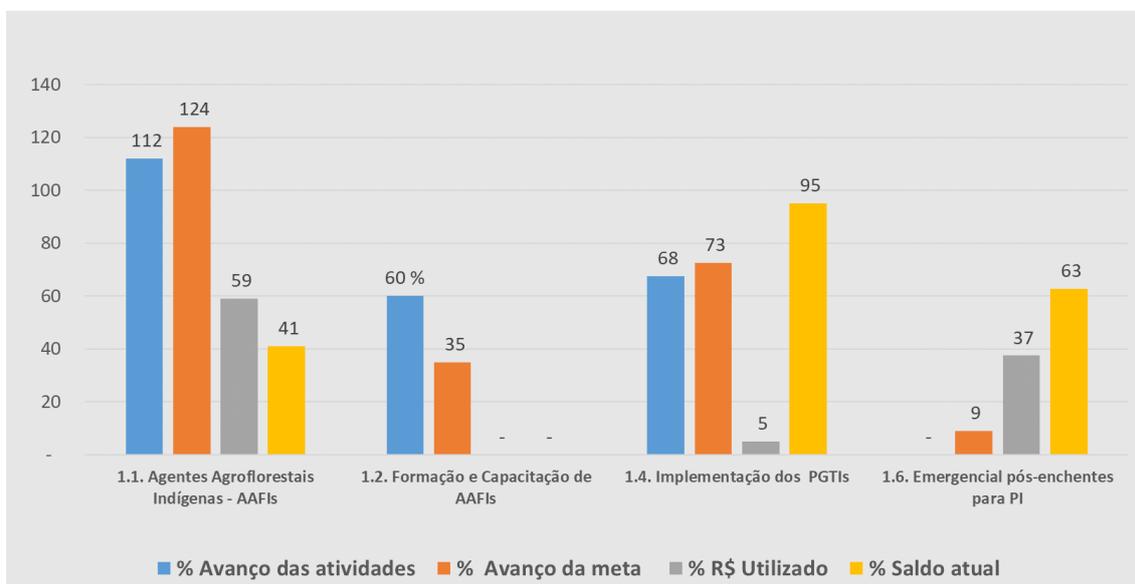


**Figura 22: Desempenho por Executora: SEMA**

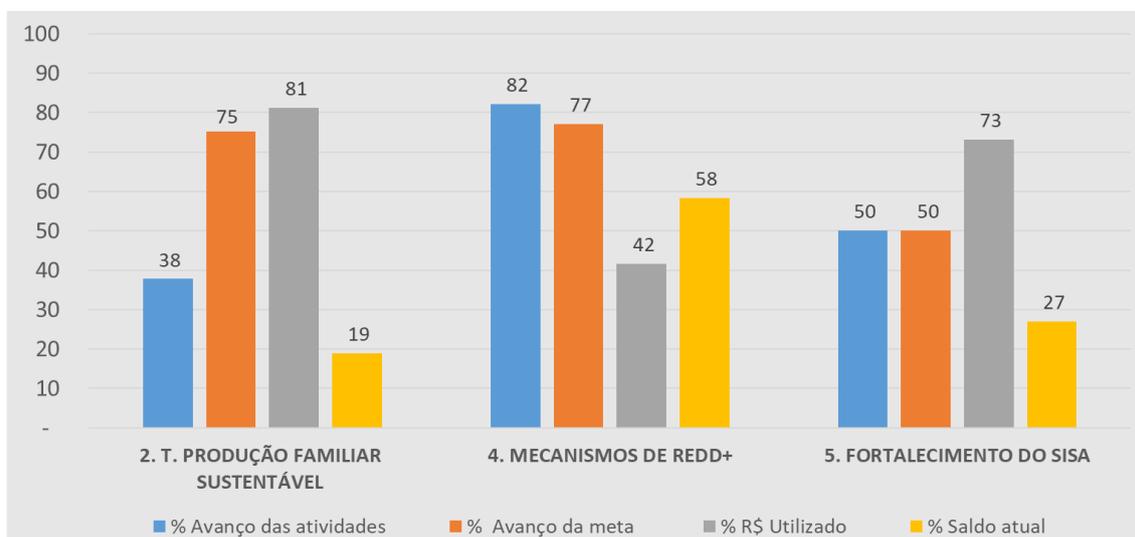


**Figura 23: Desempenho por Executora: SEE**

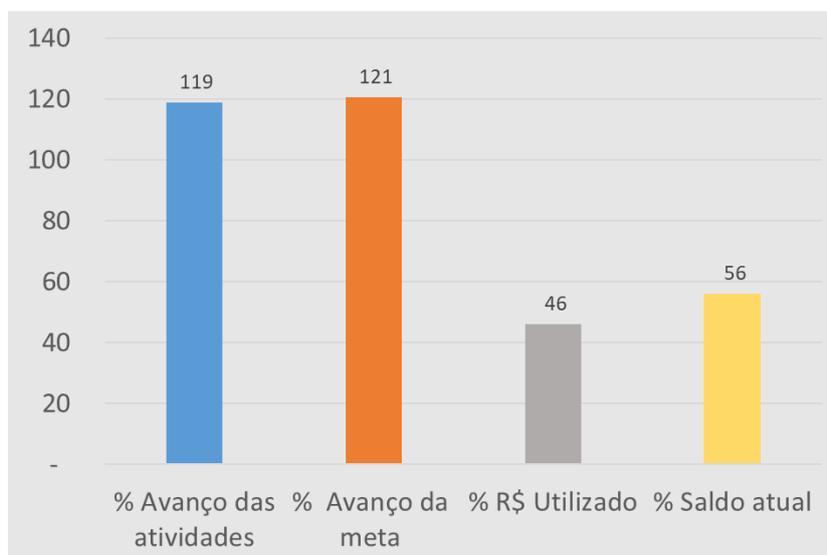


**Figura 24: Desempenho por Executora: CDSA**

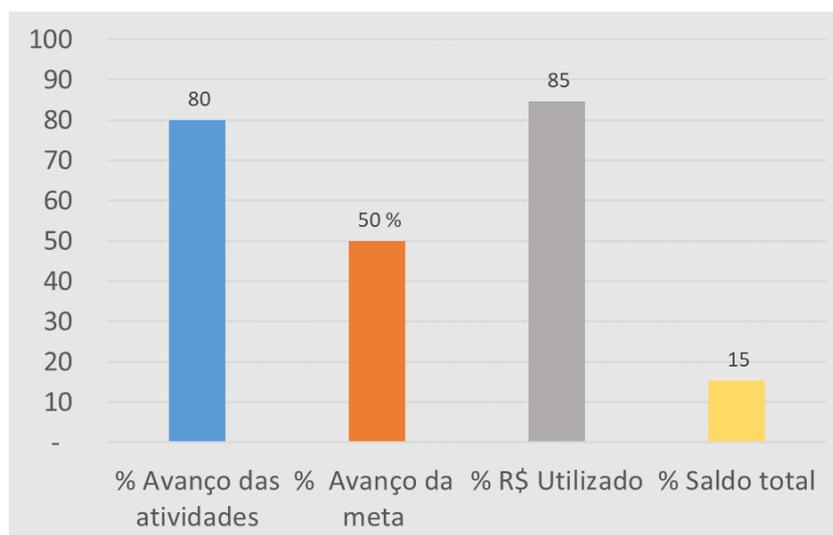


**Figura 25: Desempenho por Executora: FUNTAC**

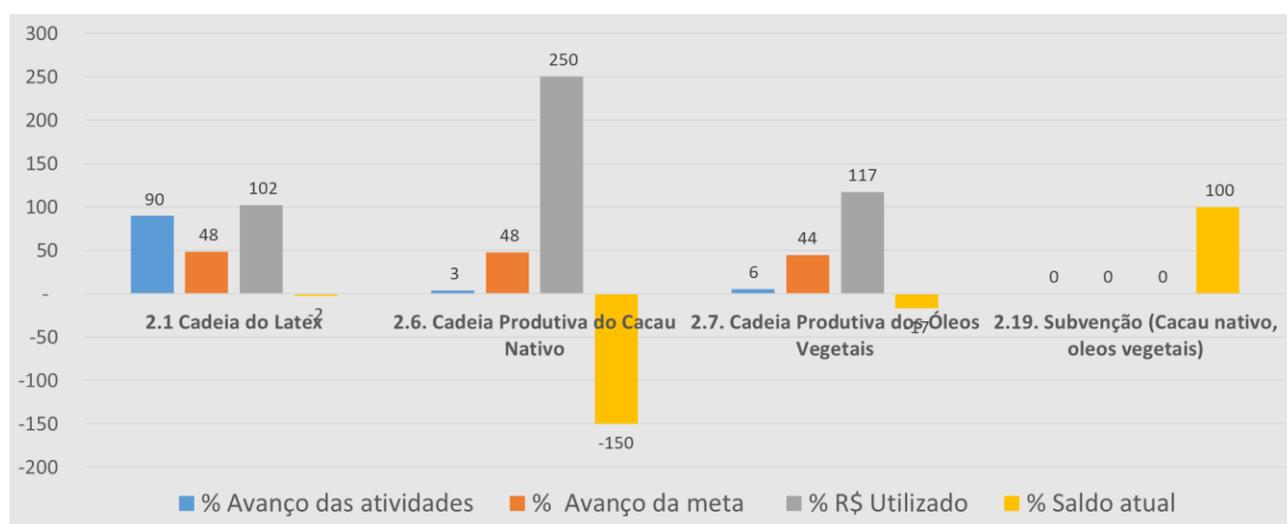


**Figura 26: Desempenho por Executora: SETE**

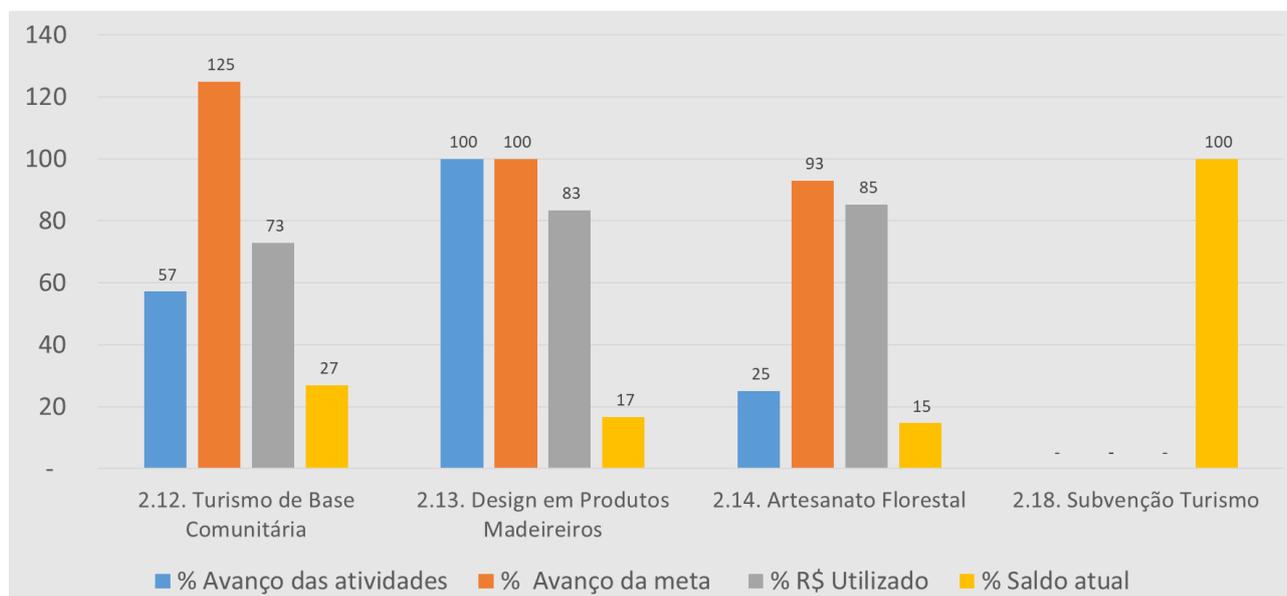


**Figura 27: Desempenho por Executora: IMC**

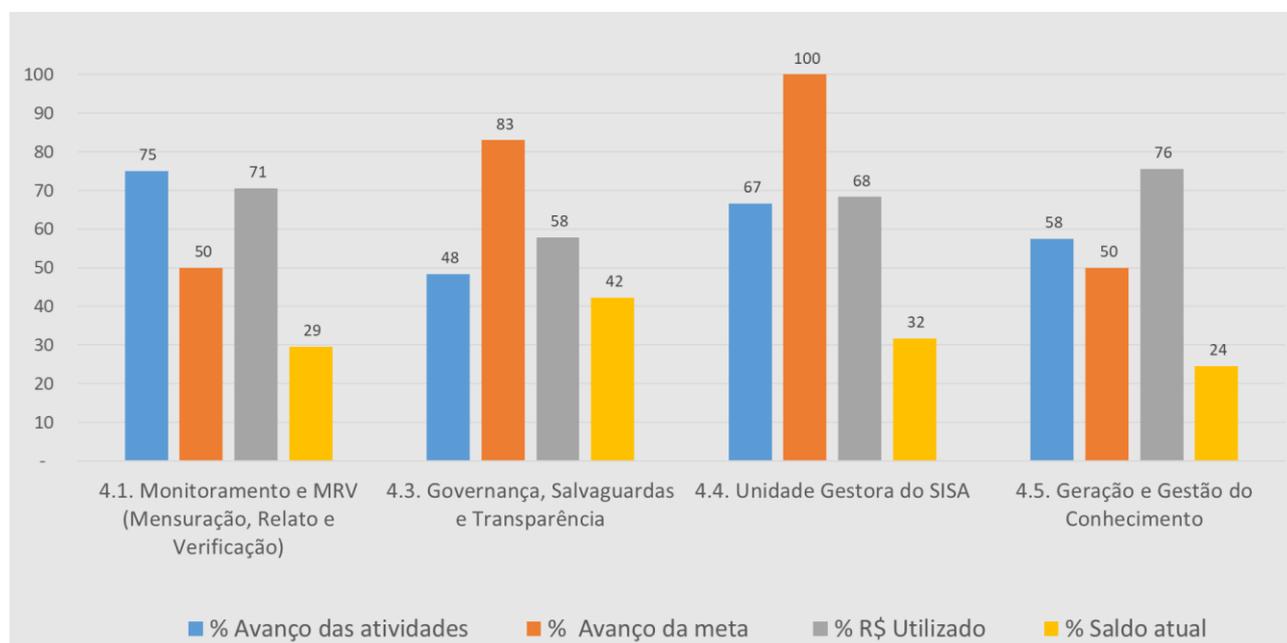


**Figura 28: Desempenho por Executora: BPA**

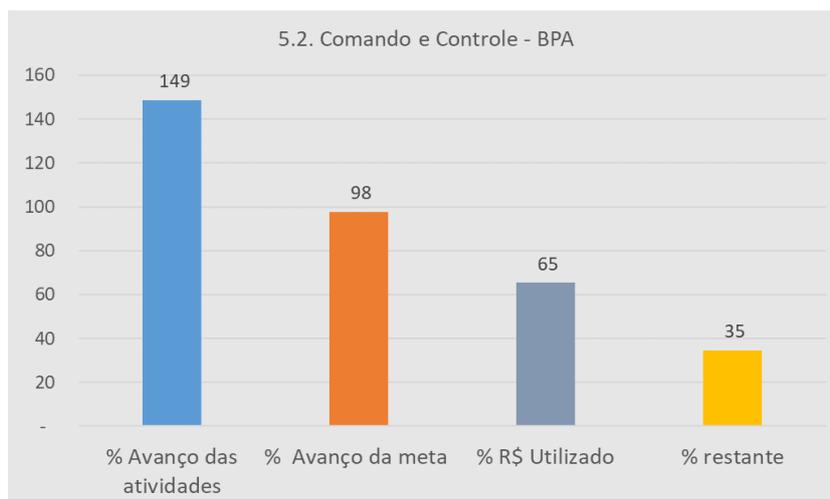


**Figura 29: Desempenho por Executora: CIOPAER**

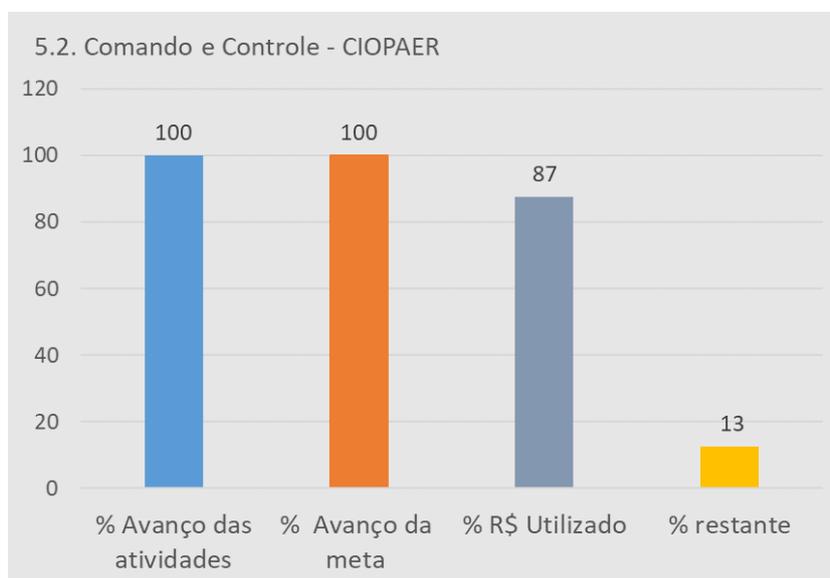


**Figura 30: Desempenho por Executora: CBMAC**

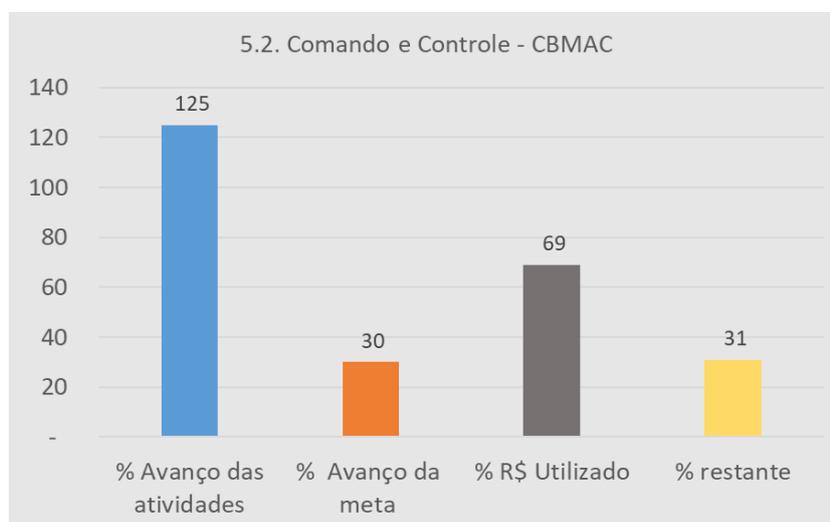


**Figura 31: Desempenho por Executora: IMAC**

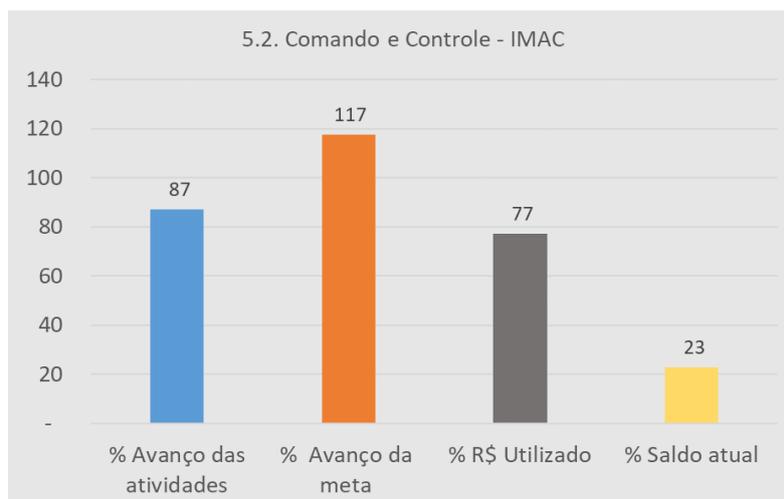

**Figura 32: Desempenho por Executora: ITERACRE**

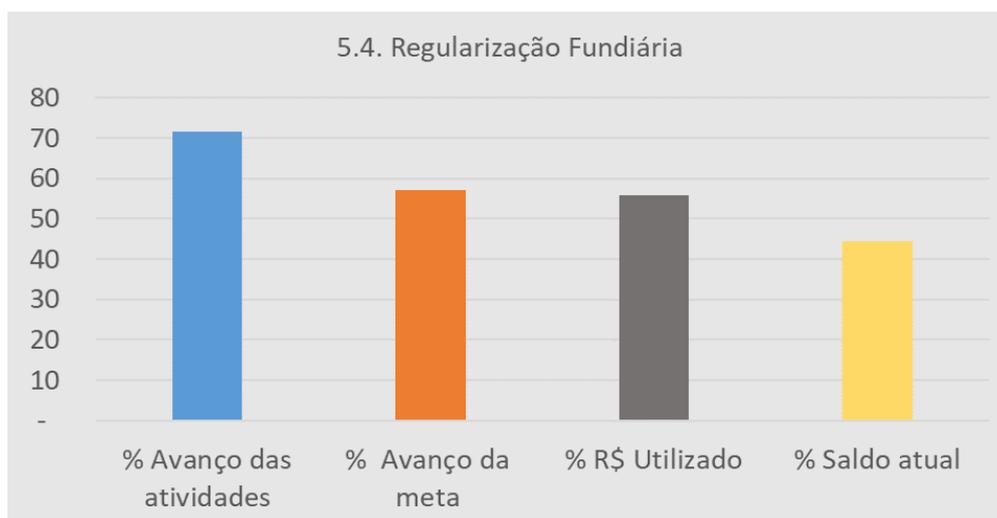

**Figura 33: Desempenho por Executora: SECOM**

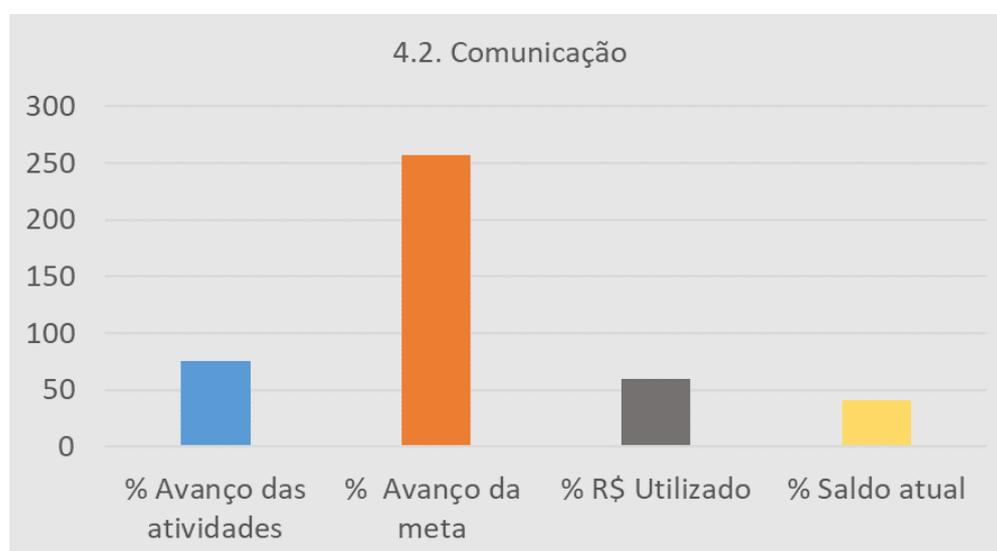

## 4. Execução financeira do Programa


### 4.1 Execução financeira geral e por Subprograma

Graças à reestruturação das ações do Programa e ao incremento do planejamento da UCP-REM e de cada executora, a execução financeira em 2023 continuou se consolidando, conseguindo ultrapassar o montante de 2022. Desta maneira, os valores efetivamente pagos no ano de 2023 atingiram R\$ **18.598.775,63** (20,4% do valor total de R\$ 91 milhões disponibilizado pelo Programa), acumulando entre 2018 e 30/06/2024 um montante pago de R\$ **79.770.845,97** sendo 87,6% do valor total desembolsado na Fase II (vide **Figuras 34 e 35**).

**Figura 34: Execução financeira até 06/2024 (em R\$ e porcentagem do total desembolsado)**

<b>2018</b>	16.302.733,98	17,9%
<b>2019</b>	4.707.851,31	5,2%
<b>2020</b>	5.194.198,96	5,7%
<b>2021</b>	10.287.548,24	11,3%
<b>2022</b>	16.613.681,72	18,2%
<b>2023</b>	18.598.775,63	20,4%
<b>01/01 a 30/06/2024</b>	8.066.056,13	8,9%
<b>Total</b>	<b>79.770.845,97</b>	<b>87,6%</b>

**Figura 35: Execução financeira por ano até 30/06/2024 (em milhões de R\$)**

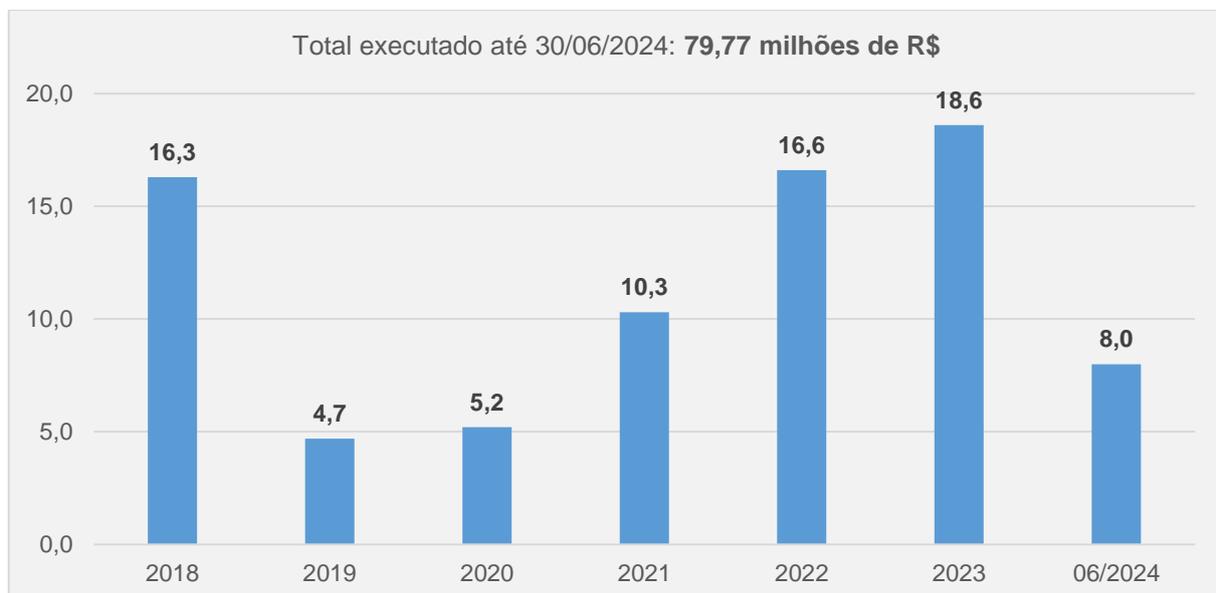

Em dezembro de 2023 o Programa apresentou um **Saldo geral** de R\$ **38.502.237,36** (42,3% do montante desembolsado) e em 30/06/2024 o saldo geral totalizou R\$ **32.166.833,94** (35,3% do total desembolsado) (**Figura 41**).


Quanto ao **comprometimento** dos recursos (contratado + em licitação), chegamos no final de dezembro de 2023 nos seguintes valores:

- um valor **contratado** de R\$ 77.324.662,74 e
- um valor **em licitação** de R\$ 1.394.635,98 em tramitação nas diversas fases dos processos (**Figura 40 Licitações**).

Desta maneira, finalizamos dezembro de 2023 com um **volume de comprometimento de R\$ 78.719.298,72** (contratado + em licitação), representando **86,5%** do valor já desembolsado na Fase II do Programa REM.

Quanto à **execução financeira por Subprograma**, é possível identificar a performance do valor efetivamente contratado até dezembro de 2023 ante o montante disponibilizado para o planejamento dos projetos, como mostra a **Figura 36**.

**Figura 36: Execução financeira por Subprograma (contratado x planejado; em % até 12/2023)**

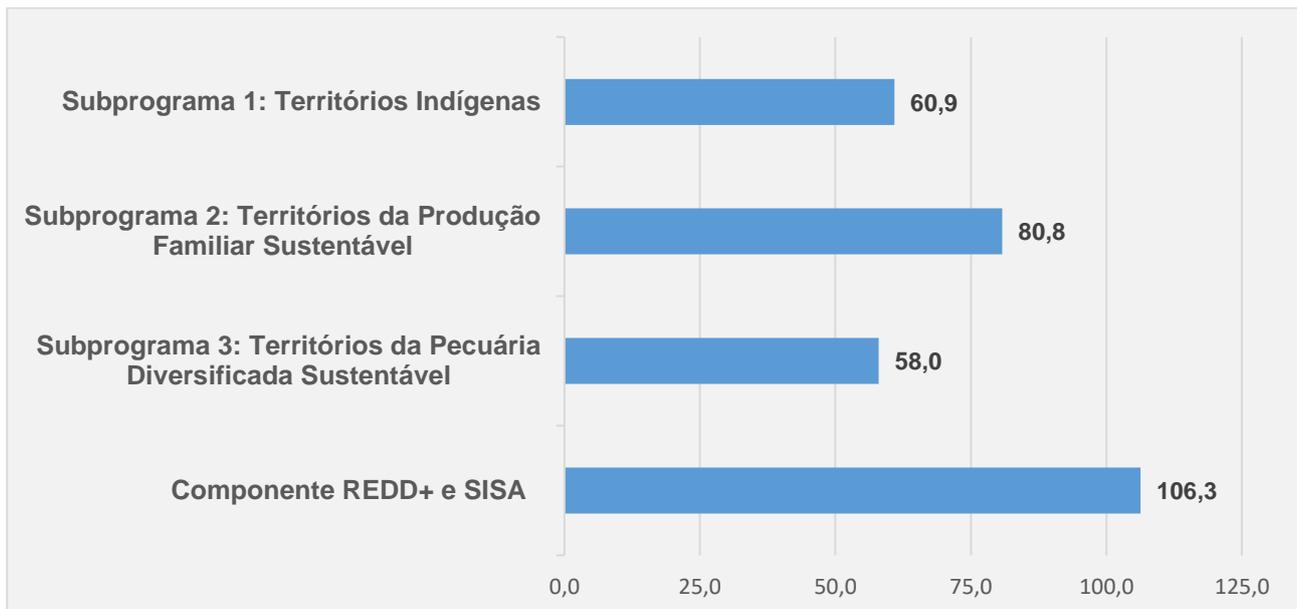

O Subprograma 3 se destaca pelo menor desempenho, sendo o único a apresentar performance abaixo de 60%. Esta situação se explica pelo fato de este subprograma ter o maior volume de recursos alocado no POA, ao mesmo tempo que foi aquele que mais precisou ser adequado, para satisfazer coerentemente a Repartição de Benefícios. Desta maneira, foram alteradas algumas iniciativas planejadas inicialmente em 2017, mas que não mostraram a performance esperada, como a **Piscicultura** e a **Bioenergia**, dando lugar aos novos projetos de **Avicultura da Galinha Caipira** e de **Energia Solar**. A partir da reestruturação do Programa e do melhor planejamento para 2024, essa performance tende a melhorar em todos os cenários dos Subprogramas.

## 4.2 Execução financeira por Executora

Apresentaremos a seguir a distribuição dos recursos e o grau de comprometimento destes por Executora. A **Figura 37** apresenta um quadro resumo da situação financeira para cada Executora, já a **Figura 40** apresenta o quadro das licitações em 2023.

Até dezembro de 2023, a distribuição dos recursos nas Executoras apresentou o seguinte cenário:

O órgão com maior volume de recursos é a **SEAGRI**, com R\$ 37.553.662,12 representando 41,2% dos recursos disponibilizados pelo Programa.

- Até dezembro de 2023, R\$ 24.601.192,72 estavam contratados, representando 65,5% do valor programado para esta executora.
- Em Licitação, em suas diversas fases, possui um montante de R\$ 936.810,80 (2,5% do valor disponibilizado à esta executora.
- A SEAGRI demonstra um volume de comprometimento (contratado + em licitação), de R\$ 25.538.003,52 sendo 68,0% do valor programado para esta Executora.

Na sequência segue a **SEMA**, com um volume de R\$ 19.618.879,33 (volume inferior ao inicialmente alocado à SEMAPI, após desmembramento dos assuntos indígenas com a criação da Secretária Extraordinária dos Povos Indígenas- SEPI), representando 21,5% dos recursos do Programa.

- Até dezembro de 2023, R\$ 18.158.043,59 estavam contratados, representando 92,6% do valor programado ao órgão.
- Não possui montante em Licitação.
- Desta maneira, a SEMA demonstra um volume de comprometimento de R\$ 18.158.043,59 (contratado + em licitação), sendo 92,6% % do valor programado para esta Executora.

A **SEPI** vem em terceira posição, com R\$ 7.926.820,03 sendo 8,7% dos recursos disponibilizados pelo Programa.

- Até dezembro de 2023, R\$ 2.298.386,74 estavam contratados, representando 29,0% do valor programado ao órgão.
- Não possui montante em Licitação.
- Assim, a SEMA demonstra um volume de comprometimento de R\$ 2.298.386,74 (contratado + em licitação), sendo 29,0% do valor programado para esta Executora.

A **SEPLAN** vem em quarta posição, com R\$ 6.858.966,73 (7,5% dos recursos disponibilizados pelo Programa)

- Até dezembro de 2023, R\$ 12.525.503,24 estavam contratados, representando 182,6% do programado.
- Assim como um montante de R\$ 457.825,18 em fase de licitação, em tramitação nas diversas fases dos processos, perfazendo 6,7% do valor alocado na SEPLAN.
- A SEPLAN demonstra um volume de comprometimento de R\$ 12.983,328,42 (contratado + em licitação), sendo 189,3% do valor programado para esta secretaria.

**Nota:** Essa distorção entre o planejado e o contratado ocorre devido ao fato de o valor inicialmente planejado para a gestão técnica, administrativa e financeira do Programa não ter contemplado a contratação da consultoria internacional (contratada desde maio de 2021), bem como a execução contínua do contrato com a empresa Detzel, que disponibiliza a equipe técnica da UCP-REM. Essa situação será saneada com o saldo da aplicação financeira ou quando o novo desembolso se efetivar.

O **IMC** vem em quinta posição, com R\$ 4.575.755,29 sendo 5,0% dos recursos disponibilizados pelo Programa.

- Até dezembro de 2023, R\$ 3.566.442,43 estavam contratados, representando 77,9% do programado.
- Não possui montante em Licitação.
- Assim, o IMC demonstra um volume de comprometimento de R\$ 3.566.442,43 (contratado + em licitação), sendo 77,9% do valor programado para esta Executora.

A **SETE** vem em sexta posição, com R\$ 4.252.267,17 (4,7% dos recursos totais).

- Até dezembro de 2023, R\$ 2.806.321,29 estavam contratados, sendo 66,0% da programação do órgão.
- Não possui montante em Licitação.
- Assim, a SEET demonstra um volume de comprometimento de R\$ 2.806.321,29 (contratado + em licitação), sendo 66,0% do valor programado para esta Executora.

A **FUNTAC** vem em sétima posição, com R\$ 3.082.794,40 representando 3,4% dos recursos disponibilizados pelo Programa.

- Até dezembro de 2023, R\$ 2.247.098,98 estavam contratados, sendo 72,9% do valor programado.
- Não possui montante em Licitação.
- Assim, a FUNTAC demonstra um volume de comprometimento de R\$ 2.247.098,98 (contratado + em licitação), sendo 72,9% do valor programado para esta Executora.

O **IMAC** vem em oitava posição, com R\$ 1.925.396,48 (2,1% dos recursos totais).

- Até dezembro de 2023, R\$ 1.798.840,39 estavam contratados, representando 93,7% da programação.
- Não possui montante em Licitação.
- Desta maneira, o IMAC demonstra um volume de comprometimento de R\$ 1.798.840,39 representando 93,7% do valor programado.

O **CBMAC** vem em nona posição, com R\$ 3.292.500,00 (3,6% dos recursos totais).

- Até dezembro de 2023, R\$ 2.269.794,51 estavam contratados, representando 69,0% do programado.
- Não possui montante em Licitação.
- Assim, o CBMAC demonstra um volume de comprometimento de R\$ 2.269.794,51 (contratado + em licitação), sendo 69,0% do valor programado.

O **ITERACRE** vem em décima posição, com R\$ 1.774.065,59 representando 1,9% dos recursos disponibilizados pelo Programa.

- Até dezembro de 2023, R\$ 985.501,69 estavam contratados, representando 55,7% do programado.
- Não possui montante em Licitação.
- Assim, o ITERACRE demonstra um volume de comprometimento de R\$ 985.501,69 (contratado + em licitação), sendo 55,7% do valor programado.

O **CIOPAER-SEJUSP** vem em décima primeira posição, com R\$ 2.564.500,00 representando 2,8% dos recursos disponibilizados pelo Programa.

- Até dezembro de 2023, R\$ 2.472.803,35 estavam contratados, sendo 96,4% do programado ao órgão.
- Não possui montante em Licitação.
- Assim, o CIOPAER-SEJUSP demonstra um volume de comprometimento de R\$ 2.472.803,35 (contratado + em licitação), sendo 96,4% do valor programado.

A **SEE** vem em décima segunda posição, com R\$ 1.261.666,17 representando 1,4% dos recursos disponibilizados pelo Programa.

- Até dezembro de 2023, o volume contratado foi de R\$ 606.102,01 representando 48,0% da programação do órgão.
- Não possui montante em Licitação.

- Assim, a SEE demonstra um volume de comprometimento de R\$ 606.102,01 (contratado + em licitação), sendo 48,0% do valor programado.

O **BPA-PMAC** vem em décima terceira posição, com R\$ 2.212.586,67 representando 2,4% dos recursos disponibilizados pelo Programa.

- Até dezembro de 2023, R\$ 1.988.565,97 estavam contratados, representando 89,9% do programado.
- Não possui montante em Licitação.
- Para o BPA-PMAC o volume comprometido é de R\$ 1.988.565,97 (contratado + em licitação), sendo 89,9% do valor programado.

A **CDSA** vem em décima quarta posição, com R\$ 599.134,47 representando 0,6% dos recursos disponibilizados pelo Programa.

- Até dezembro de 2023, R\$ 507.340,87 estavam contratados, representando 84,68% do programado.
- Não possui montante em Licitação.
- Para a CDSA o volume comprometido é de R\$ 507.340,87 (contratado + em licitação), sendo 84,7% do valor programado.

A **SECOM** vem em última posição, com R\$ 674.461,64 representando 0,7% dos recursos disponibilizados pelo Programa.

- Até dezembro de 2023, R\$ 492.724,96 estavam contratados, sendo 73,0% do programado.
- Não possui montante em Licitação.
- Para a SECOM o volume comprometido é de R\$ 492.724,96 (contratado + em licitação), sendo 73,0% do valor programado para esta Executora.

Figura 37: Execução Financeira por Executora – até dezembro de 2023 (em R\$)

Programa REM Acre Fase II							
Secretarias	Planejado PDI 01 e 02	Contratado + em Licitação	Desembolsado / Pago	Saldo Conveniado / Contratado	Valor a Conveniar / Contratar	% do planejado	% do contratado
BPA - PMAC	2.212.586,67	1.988.565,97	1.300.437,26	688.128,71	224.020,70	2,25%	89,88%
CBMAC	3.292.500,00	2.269.794,51	2.269.746,29	48,22	1.022.705,49	3,34%	68,94%
CDSA	599.134,45	507.340,87	507.340,87	-	91.793,58	0,61%	84,68%
CIOPAER / SEJUSP	2.933.390,07	2.472.803,35	2.052.796,73	420.006,62	460.586,72	2,98%	84,30%
FUNTAC	3.082.794,41	2.247.098,98	2.222.730,13	24.368,85	835.695,43	3,13%	72,89%
IMAC	1.925.396,48	1.798.840,39	1.698.043,79	100.796,60	126.556,09	1,96%	93,43%
IMC	4.575.755,29	3.566.442,43	2.876.249,23	690.193,20	1.009.312,86	4,65%	77,94%
ITERACRE	1.774.065,59	985.501,69	984.408,61	1.093,08	788.563,90	1,80%	55,55%
SEAGRI	37.553.662,12	25.538.003,52	21.823.791,76	3.714.211,76	12.015.658,60	38,14%	68,00%
SECOM	674.461,64	492.724,96	459.524,42	33.200,54	181.736,68	0,69%	73,05%
SEE	1.261.666,17	606.102,01	543.558,23	62.543,78	655.564,16	1,28%	48,04%
SEMA	19.618.879,33	18.158.043,59	17.206.294,41	951.749,18	1.460.835,74	19,93%	92,55%
SEPI	7.926.820,03	2.298.386,74	984.741,90	1.313.644,84	5.628.433,29	8,05%	29,00%
SEPLAN	6.490.076,66	12.983.328,42	12.320.466,26	662.862,16	- 6.493.251,76	6,59%	200,05%
SETE	4.252.267,17	2.806.321,29	2.596.118,75	210.202,54	1.445.945,88	4,32%	66,00%
<b>TOTAL</b>	<b>98.460.203,03</b>	<b>78.719.298,72</b>	<b>69.846.248,64</b>	<b>8.873.050,08</b>	<b>19.740.904,31</b>	<b>100%</b>	

**Figura 38: Execução Financeira segundo a Repartição de Benefícios – Pagamentos por ano até dezembro de 2023 (em R\$)**

Programa REM Acre Fase II											
ESTRATÉGIA DE REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS											
Componentes	Planejado PDI 01 e 02	Valor Contratado	Pago em 2018	Pago em 2019	Pago em 2020	Pago em 2021	Pago em 2022	Pago em 2023	TOTAL PAGO	Saldo Contratado	Valor a Contratar
<b>I. Atividades à Nível Local / Beneficiários (70%)</b>	<b>71.017.641,19</b>	<b>49.543.832,10</b>	<b>11.194.790,87</b>	<b>2.558.896,67</b>	<b>3.948.510,28</b>	<b>6.587.953,63</b>	<b>10.622.124,78</b>	<b>8.509.382,60</b>	<b>43.421.658,83</b>	<b>6.122.173,27</b>	<b>21.473.809,09</b>
<b>Subprograma 1:</b> Territórios Indígenas	16.066.107,64	9.789.772,11	2.229.785,35	479.833,84	846.722,97	1.486.419,70	1.568.950,47	1.801.851,15	8.413.583,48	1.376.188,63	6.276.335,53
<b>Subprograma 2:</b> Territórios da Produção Familiar Sustentável	34.555.661,65	27.927.849,41	3.848.235,71	1.779.552,23	1.936.408,11	4.022.127,97	6.073.356,90	5.874.340,55	23.550.729,97	4.377.119,44	6.627.812,24
<b>Subprograma 3:</b> Territórios da Pecuária Diversificada Sustentável	20.395.871,90	11.826.210,58	5.116.769,81	299.510,60	1.165.379,20	1.079.405,96	2.963.088,91	833.190,90	11.457.345,38	368.865,20	8.569.661,32
<b>II. Fortalecimento Institucional e Políticas Públicas (30%)</b>	<b>27.442.561,84</b>	<b>29.175.466,62</b>	<b>5.107.943,11</b>	<b>2.148.954,64</b>	<b>1.245.688,68</b>	<b>3.699.594,61</b>	<b>5.995.502,90</b>	<b>8.279.831,20</b>	<b>26.424.589,81</b>	<b>2.750.876,81</b>	<b>- 1.732.904,78</b>
Mecanismos de REDD+	6.951.268,66	5.381.184,92	4.431.224,70	1.978.120,93	1.019.430,15	1.149.250,91	1.585.486,82	- 5.651.125,80	4.512.387,71	868.797,21	1.570.083,74
Gestão e Fortalecimento do SISA	20.491.293,18	23.794.281,70	676.718,41	170.833,71	226.258,53	1.077.049,00	2.255.176,71	13.930.957,00	21.912.202,10	1.882.079,60	- 3.302.988,52
<b>TOTAL</b>	<b>98.460.203,03</b>	<b>78.719.298,72</b>	<b>16.302.733,98</b>	<b>4.707.851,31</b>	<b>5.194.198,96</b>	<b>10.287.548,24</b>	<b>16.617.627,68</b>	<b>16.789.213,80</b>	<b>69.846.248,64</b>	<b>8.873.050,08</b>	<b>19.740.904,31</b>

**Figura 39: Pagamento de Diárias por Secretaria – em 31/12/2022 (em R\$)**

<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DIÁRIAS DO REM II</b>							
<b>SECRETARIA</b>	<b>Pago em 2018</b>	<b>Pago em 2019</b>	<b>Pago em 2020</b>	<b>Pago em 2021</b>	<b>Pago em 2022</b>	<b>Pago em 2023 (até agosto)</b>	<b>Total Pago</b>
<b>BPA - PMAC</b>	29.056,55	48.632,05	-	68.970,45	-	31.215,60	<b>177.874,65</b>
<b>CBMAC</b>	172.255,10	43.250,20	-	-	1.883,70	251.846,83	<b>469.235,83</b>
<b>CDSA</b>	2.922,15	33.875,60	29.129,00	11.670,30	-	-	<b>77.597,05</b>
<b>CIOPAER / SEJUSP</b>	32.288,05	7.816,40	2.499,60	53.820,30	14.199,75	89.237,11	<b>199.861,21</b>
<b>FUNTAC</b>	35.919,05	15.848,85	35.997,30	87.392,45	39.882,52	96.028,12	<b>311.068,29</b>
<b>IMAC</b>	20.379,80	88.921,30	127.144,35	-	171.866,17	292.011,31	<b>700.322,93</b>
<b>IMC</b>	-	103.793,55	6.694,15	86.066,80	160.539,50	134.596,33	<b>491.690,33</b>
<b>ITERACRE</b>	110.535,95	7.772,85	23.097,90	20.372,15	28.753,22	96.959,47	<b>190.532,07</b>
<b>SEAGRI</b>	63.942,55	16.074,35	8.879,20	38.568,25	127.534,96	138.191,95	<b>393.191,26</b>
<b>SEE</b>	26.365,15	36.764,25	39.519,45	-	67.429,60	20.800,94	<b>190.879,39</b>
<b>SEMA</b>	133.278,85	87.051,88	9.788,35	119.159,64	208.466,20	214.944,07	<b>772.688,99</b>
<b>SEPI</b>	-	-	-	-	-	51.782,33	<b>51.782,33</b>
<b>SEPLAN</b>	15.701,35	30.287,88	-	464,10	57.601,88	111.253,48	<b>215.308,69</b>
<b>SETE</b>	169.845,25	146.421,30	87.283,50	178.384,40	84.143,16	185.255,15	<b>851.332,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>812.489,80</b>	<b>666.510,46</b>	<b>370.032,80</b>	<b>664.868,84</b>	<b>962.300,66</b>	<b>1.714.981,43</b>	<b>5.191.183,99</b>

**Figura 40: Licitações em 2022 por Subexecutora**

SECRETARIA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	INÍCIO DO PROCESSO	VALOR PREVISTO (R\$)	STATUS
SEAGRI	Pregão Eletrônico	12/04/2023	157.825,18	Em fase de Homologação
SEAGRI	Pregão Eletrônico	11/05/2023	300.000,00	Em fase de Elaboração de Parecer
SEAGRI	Pregão Eletrônico	05/04/2023	266.810,80	Aguardando Licitação (aviso de licitação dia 18/01/2024)
SEAGRI	Pregão Eletrônico	26/10/2023	670.000,00	Aguardando Homologação
<b>TOTAL</b>			<b>1.394.635,98</b>	

Na próxima página, a **Figura 41** apresenta a **Movimentação financeira** na conta do Programa REM (Fonte 200), mês a mês, desde o início da Fase II até junho de 2024, documentando os **Rendimentos** conseguidos graças à aplicação dos valores desembolsados assim como os respectivos **Saldos** mês a mês.

**Figura 41: Movimentação financeira na conta do Programa REM até 30/06/2024**

MÊS	SALDO ANTERIOR	LIBERAÇÕES KFW/Beis	DEVOLUÇÕES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS *	SALDO FINAL (A)
dez/17	-	19.665.000,00		1.289,08	395,49	19.665.893,59
jan/18	19.665.893,59			28.413,77		19.694.307,36
fev/18	19.694.307,36			21.062,87		19.715.370,23
mar/18	19.715.370,23			22.416,88	19.663,70	19.718.123,41
abr/18	19.718.123,41			18.796,32	1.270.188,10	18.466.731,63
mai/18	18.466.731,63		11.944,95	72.794,89	420.588,43	18.130.883,04
jun/18	18.130.883,04		934,25	87.234,00	1.191.069,00	17.027.982,29
jul/18	17.027.982,29		189,90	76.102,43	3.202.604,16	13.901.670,46
ago/18	13.901.670,46		423,90	70.927,28	2.656.391,73	11.316.629,91
set/18	11.316.629,91		3.167,26	47.602,18	1.079.612,25	10.287.787,10
out/18	10.287.787,10		1.436,05	48.166,57	1.979.513,23	8.357.876,49
nov/18	8.357.876,49			37.635,60	1.089.046,27	7.306.465,82
dez/18	7.306.465,82	46.614.685,31	332,70	45.993,74	3.393.661,62	50.573.815,95
jan/19	50.573.815,95			200.938,99		50.774.754,94
fev/19	50.774.754,94			184.347,62	19.472,76	50.939.629,80
mar/19	50.939.629,80			178.528,38	6.381,05	51.111.777,13
abr/19	51.111.777,13			194.920,40	229.944,73	51.076.752,80
mai/19	51.076.752,80			206.662,73	362.137,06	50.921.278,47
jun/19	50.921.278,47		302,00	176.027,28	193.883,50	50.903.724,25
jul/19	50.903.724,25			214.061,54	311.743,64	50.806.042,15
ago/19	50.806.042,15			194.295,56	746.959,70	50.253.378,01
set/19	50.253.378,01			223.532,70	397.293,41	50.079.617,30
out/19	50.079.617,30			222.558,83	996.105,93	49.306.070,20
nov/19	49.306.070,20		1.050,00	151.268,41	618.400,37	48.839.988,24
dez/19	48.839.988,24		6.419,25	170.548,30	825.529,16	48.191.426,63
jan/20	48.191.426,63		302,00	178.652,77	365.937,80	48.004.443,60
fev/20	48.004.443,60			130.987,37	281.022,14	47.854.408,83
mar/20	47.854.408,83		1.768,20	67.845,03	380.944,08	47.543.077,98
abr/20	47.543.077,98			1.487,83	570.026,30	46.974.539,51
mai/20	46.974.539,51		332,70	154.137,35	56.806,11	47.072.203,45
jun/20	47.072.203,45		1.641,90	114.067,20	149.929,46	47.037.983,09
jul/20	47.037.983,09		6.427,40	116.621,99	220.533,63	46.940.498,85
ago/20	46.940.498,85		3.329,95	67.761,23	416.678,82	46.594.911,21
set/20	46.594.911,21		189,90	(938,27)	640.222,72	45.953.940,12
out/20	45.953.940,12			55.016,77	174.494,13	45.834.462,76
nov/20	45.834.462,76		1.856,40	70.875,18	129.222,50	45.777.971,84
dez/20	45.777.971,84		1.403,00	164.672,09	1.808.381,27	44.135.665,66
jan/21	44.135.665,66			71.322,56	119.793,61	44.087.194,61
fev/21	44.087.194,61		2.647,86	34.266,70	243.163,65	43.880.945,52
mar/21	43.880.945,52		3.285,00	42.580,80	796.001,98	43.130.809,34
abr/21	43.130.809,34		3.133,35	111.815,65	1.173.178,75	42.072.579,59
mai/21	42.072.579,59		419,63	101.718,27	354.136,90	41.820.580,59
jun/21	41.820.580,59		427,47	127.369,93	259.008,56	41.689.369,43
jul/21	41.689.369,43		284,85	186.161,00	549.249,57	41.326.565,71
ago/21	41.326.565,71	24.757.898,95		220.795,88	1.170.026,18	65.135.234,36
set/21	65.135.234,36			323.985,16	510.997,28	64.948.222,24
out/21	64.948.222,24			299.821,07	695.971,78	64.552.071,53
nov/21	64.552.071,53			409.563,06	1.756.082,47	63.205.552,12
dez/21	63.205.552,12		1.586,00	468.838,21	2.659.937,51	61.016.038,82
jan/22	61.016.038,82			516.489,92	46.459,06	61.486.069,68
fev/22	61.486.069,68			525.975,02	2.107.650,51	59.904.394,19
mar/22	59.904.394,19			547.132,39	1.591.515,48	58.860.011,10
abr/22	58.860.011,10		570,00	458.429,71	729.611,61	58.589.399,20
mai/22	58.589.399,20			632.925,42	1.097.115,76	58.125.208,86
jun/22	58.125.208,86		730,70	601.312,60	357.208,37	58.370.043,79
jul/22	58.370.043,79		27.014,35	594.347,77	1.352.209,57	57.639.196,34
ago/22	57.639.196,34		1.282,07	674.024,11	2.046.855,61	56.267.646,91
set/22	56.267.646,91		2.367,74	620.909,34	1.068.394,71	55.822.529,28
out/22	55.822.529,28		322,88	568.732,92	588.592,40	55.802.992,68
nov/22	55.802.992,68		1.183,87	553.525,94	2.230.244,78	54.127.457,71
dez/22	54.127.457,71			592.444,90	3.397.823,86	51.322.078,75
jan/23	51.322.078,75		-	544.486,85	-	51.866.565,60
fev/23	51.866.565,60		-	396.784,30	1.030.840,78	51.232.509,12
mar/23	51.232.509,12		2.824,37	575.113,28	768.594,89	51.041.851,88
abr/23	51.041.851,88		53,81	431.796,70	655.446,15	50.818.256,24
mai/23	50.818.256,24		1.074,00	590.570,57	1.215.886,47	50.194.014,34
jun/23	50.194.014,34		-	549.304,33	526.724,95	50.216.593,72
jul/23	50.216.593,72		861,12	531.637,86	3.642.679,31	47.106.413,39
ago/23	47.106.413,39		-	546.278,54	1.694.332,19	45.958.359,74
set/23	45.958.359,74		2.231,25	450.643,00	1.457.306,93	44.953.927,06
out/23	44.953.927,06		9.959,50	413.057,57	3.169.037,79	42.207.906,34
nov/23	42.207.906,34		1.937,24	379.729,75	1.913.201,64	40.676.371,69
dez/23	40.676.371,69		2.076,05	348.514,15	2.524.724,53	38.502.237,36
jan/24	38.502.237,36			368.518,60	635.399,78	38.235.356,18
fev/24	38.235.356,18			299.080,68	606.339,97	37.928.096,89
mar/24	37.928.096,89			305.129,71	1.966.741,88	36.266.484,72
abr/24	36.266.484,72			266.519,48	2.451.743,22	34.081.260,98
mai/24	34.081.260,98			253.704,71	1.134.515,87	33.200.449,82
jun/24	33.200.449,82			237.699,53	1.271.315,41	32.166.833,94
jul/24						-
ago/24						-
set/24						-
out/24						-
nov/24						-
dez/24						-
<b>Totais</b>		<b>91.037.584,26</b>	<b>109.724,82</b>	<b>20.790.370,83</b>	<b>79.770.845,97</b>	<b>32.166.833,94</b>

**Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no extrato bancário**

Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A):	<b>32.166.833,94</b>
Saldo informado no extrato bancário (B):	<b>31.469.250,91</b>
Diferença de (A) - (B):	<b>697.583,03</b>
Patronal Janio	1.960,00
Bloqueio Judicial	7.700,00
taxa bancária abril	132,00
taxa bancária maio	330,00
Entrada sem referência	(387,75)
Bloqueio Judicial	4.333,71
Pagamento em Duplicidade	59.058,60
Taxa Bancária Maio 2023	748,00
Pagamento Errado SEAGRI	73.455,33
Pagamento Errado SEAGRI	207.230,00
Taxa Bancária Junho 2023	66,00
Débito a confirmar com Caixa	5.732,27
Pagamento de diárias	538,12
SEAGRI via conta transitória	
Outros Valores	336.686,75
	<b>697.583,03</b>

## **Anexos (Planilhas Excel anexadas ao documento)**

**Anexo 1 - Aquisições e Contratações - 2023**

**Anexo 2 - Aquisições e Contratações - 2024**

**AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES 2023 - REM/KFW**

ITEM	PROCESSO SEI	FORNECEDOR	SUBEXECUTORA	MODALIDADE	OBJETO	VALOR REM (200)	VALOR TOTAL CONTRATADO	CONTRATO OU EMPENHO
1	4010.012290.00271/2022-81	LIMA E ABRAO LTDA	SEPLAN/DEPGSP	Dispensa de Licitação	Serviço de Pintura serigráfica na parte de trás de 20 (vinte) coletes, com a identificação funcional do Programa REM Fase II no Estado do Acre, no âmbito do SISA, visando atender as necessidades do programa.	R\$ 315,00	R\$ 315,00	ORDEM DE SERVIÇOS 07-2023 - NOTA DE EMPENHO Nº 4010.012290.00271/2022-81 - CONTRATO 08/2023 - DOE 13479 - Extrato de Contrato (6198956)
2	0859.013150.00036/2021-54	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAI-DR/AC	SEICETUR	Reconhecimento e Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 1/2023	"Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em apoio à cadeia produtiva para melhorias do setor artesanal com produtos de designer de produtos madeireiros, bem como a geração de novas oportunidades de negócios, no âmbito do Programa Global REDD Early Movers (REM) Acre – Fase II."	R\$ 18.820,00	R\$ 18.820,00	CONTRATO Nº 3/2023 (6315622)
3	0044.012028.00023/2023-38	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	BPA	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2022/SEET - CEL 01, proveniente do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO SRP Nº 230/2022	Aquisição de equipamentos de informática, visando a modernização tecnológica das unidades administrativas e operacionais da Polícia Militar do Estado do Acre - PMAC	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	CONTRATO Nº 028/2023 (6558509)
4	0859.013133.00060/2023-72	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	SETE	Adesão ao Processo de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 373/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 043/2023	Contratação de empresa para prestação de serviço de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas com combustíveis em postos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético, com fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo.	R\$ 44.622,55	R\$ 44.622,55	Contrato nº 20/2023 (7)178715
5	0859.013146.00001/2023-91	INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – IEPTec	SETE	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2023/SEET	Termo de Cooperação Técnica e Financeira tem por objeto promover a realização de Oficina de Gastronomia Acreana com carga horária de 40 (quarenta) horas para um público de 60 (sessenta) estudantes, organizados em 02 (duas) turmas com pessoas oriundos das comunidades da Serra do Divisor, Trilha Chico Mendes, Rio CROA, Seringal Cachoeira, Reserva Extrativista Cazumbá Iracema e empreendedores de base comunitária da Feira de Economia Solidária da Praça do Novo Mercado Velho.	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2023/SEET (6819581)

6	0853.013720.00168/2022-13	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	SEAGRI	PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 027/2023	Apostilarmos a fonte de recursos - 27030200 do Programa REM KfW Fase II ao Contrato N° 50/2023 7794487, no valor total de R\$ 181.788,19 (cento e oitenta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos)	R\$ 181.788,19	R\$ 181.788,19	Termo de Apostilamento Contrato n° 50/2023 (8490637)
7	4022.013450.00046/2023-24/4022.013452.00004/2022-19	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA.	IMAC	Pregão Eletrônico SRP n.º 425/2022	Aquisição de equipamentos e ferramentas de informática, com objetivo de suprir as demandas do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC	R\$ 279.600,00	R\$ 234.175,00	1º Termo de Apostilamento do Contrato N° 18/2023
8	0044.012029.00121/2023-74/0044.011995.00020/2022-12	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR	BPA	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 394/2022.	Prestação de serviço de administração e gerenciamento informatizado para serviços contínuos e ininterruptos de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos, com o fornecimento de peças e acessórios multimarcas, guincho e lavagem de veículos, através de redes de estabelecimentos credenciados pela contratada, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota, com tecnologia de cartão eletrônico com chip (tipo smart) ou cartão com tarja magnética	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	1º Termo Apostilamento do Contrato n° 13/2023 - FONTE
9	0820.013389.00005/2023-81	ACRE INDÚSTRIA REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E PROJETOS EM INCENDIO LTDA	IMC	Adesão da Ata Registro de Preço n.º. 0009/2023 - Pregão Presencial SRP N° 008/2023	Contratação de empresa especializada em prestação serviços de locação de veículos, sem motorista, para transporte terrestre de materiais, servidores, prestadores de serviços e colaboradores, visando atender as ações desenvolvidas pelo Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais – IMC, no âmbito do Programa REM Acre Fase II.	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	Contrato n° 009/2023 (9001211)
10	0044.012028.00149/2023-11/0044.011995.00128/2023-96	- SUPREME UNIDADES MOVEIS LTDA - EDUARDO PISSANGO DA SILVA -N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	BPA	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP N° 231/2023	Contratação de empresas para fornecimento de embarcações, motores de pôpa e de carretas de transporte para o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA)	152.100,00	152.100,00	Contratos n° 131/2023 - 132/2023 - 133/2023 - 134/2023 ( 9334230 - 9334255 - 9334267 - 9334279)
11	4010.012290.00320/2022-86	FLORESTA EMPREENDIMENTOS	SEPLAN/DEPGSP	Pregão Presencial Por Sistema de Registro de Preços n° 018/2023	Contratação de empresa especializada nos Serviços de Fornecimento de Alimentação (coquetel, coffee break, café da manhã e brunch), para atender as necessidades dos eventos para o ano de 2023, que serão promovidos pelo Núcleo de Monitoramento (UCP/DEREM) do Programa REM/ACRE FASE II no Estado do Acre.	66.914,50	210.996,00	Contrato 20 (6507837) R\$ 109.800,00
								Contrato 23 (6544785) R\$ 15.900,00

12	4010.012290.00038/2023-80	WEB TRIP	SEPLAN/DEPGSP	Pregão Eletrônico Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 096/2023, do tipo menor preço por item	Contratação de empresa para, sob demanda, prestar serviços de agenciamento de viagens, especializada em emissão de passagens aéreas nacionais e intermunicipais e, eventualmente, internacionais, bem como passagens terrestres nacionais e intermunicipais, compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo "código localizador", incluindo o seguro de assistência em viagem internacional, com proposta de menor valor de agenciamento, visando atender às necessidades da Unidade de Coordenação do Programa - UCP REM Acre Fase II, na Secretaria Estadual de Planejamento (SEPLAN).	150.000,00	400.000,00	Contrato 70/2023 (7570667)
13	0044.011994.00145/2023-24	ANAX BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	BPA	PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 292/2023	Aquisição de Telefone móvel via satélite, com adaptador AC/DC 127/220V; Bateria recarregável, com autonomia mínima de 4 horas em conversação e 30 horas em standby; Envio de mensagens SMS; Carregador veicular, Capa de couro, Headset (fone de ouvido e microfone), Antena portátil auxiliar e adaptador, Cabo de dados USB, Manual do Usuário; Dimensões: 14,3cm de comprimento x 5,5 cm de largura x 3,0 cm de profundidade, Peso: 266 g.	10.984,99	10.984,99	Contrato 103/2023 (9113489)
14	0044.011994.00144/2023-80	RID Solucoes Integradas LTDA	BPA	PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 292/2023	Serviço de recarga de créditos para telefonia móvel via satélite com validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sistema pré pago, pacote de recarga com 600 (seiscentos) créditos unidades, com serviço de ativação de SIM card, incluído a taxa de ativação e todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente neste fornecimento. Compatibilidade com aparelhos IRIDIUM	21.599,97	21.599,97	Contrato 104/2023 (9113469)
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 1.079.957,01</b>	<b>R\$ 1.560.401,70</b>	

**AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES 2024 - REM/KFW**

ITEM	PROCESSO SEI	SUBEXECUTORA	FORNECEDOR	MODALIDADE	OBJETO	VALOR REM (200)	VALOR TOTAL CONTRATADO	CONTRATO OU EMPENHO
1	0722.017341.00007/2023-68	SEPI	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,	ADESÃO a ATA SRP Nº 002/2023- PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 216/2023, da Casa Militar do Acre.	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e diesel S10), bem como de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos automotores em rede de estabelecimentos especializados e credenciados pela contratada para a aquisição de peças, acessórios e contratação de serviços de oficina mecânica em geral, mediante uso de cartão microprocessado (com chip ou magnético)	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	01/2024
2	0722.017344.00006/2024-00	SEPI	L F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	DISPENSA EMERGENCIAL, com fulcro no art. 75 inciso VIII da Lei nº 14.133/2021	Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material de consumo diversos (cestas básicas familiar, kit de higiene pessoal, kit de material de limpeza, água mineral de 500ml - pct c/12garrafas	R\$ 1.671.710,00	R\$ 1.671.710,00	005/2024
3	0722.017341.00018/2024-29	SEPI	L F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	DISPENSA EMERGENCIAL, com fulcro no art. 75 inciso VIII da Lei nº 14.133/2021	Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de Kit Dormitório composto por Rede de Dormir com Cortinado (mosqueteiro)visando atender as populações indígenas afetadas pelas cheias de rios e igarapés, decorrentes de forte chuvas, em cumprimento às atribuições da Secretaria Extraordinária dos povos Indígenas - SEPI	R\$ 314.060,00	R\$ 314.060,00	CONTRATO Nº 007/2024 (0010228356)
4	0853.013720.00024/2024-11 0853.012666.00043/2024-59	SEAGRI	C. A DA COSTA - ME	DISPENSA EMERGENCIAL, com fulcro no art. 75 inciso VIII da Lei nº 14.133/2021	aquisição de gêneros alimentícios, com vistas a atender 5.000 produtores e produtoras rurais direta e indiretamente impactados pelas cheia dos rios, conforme Plano Emergencial do Programa REM/ACRE -Fase II,	R\$ 750.350,00	R\$ 750.350,00	CONTRATO Nº 025/2024 (0011184330)
5	0044.012028.00049/2024-67	BPA	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	ADESÃO a ATA SRP Nº 023/2023- PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 358/2023, da Polícia Militar.	Contratação de prestação de serviços, sob demanda, de agenciamento de viagens, especializada em emissão de passagens aéreas nacionais, internacionais e intermunicipais, compreendendo serviços de reservas, marcação, cancelamento, remarcação, inclusão de tarifas de bagagens, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo "código localizador" e Seguro de Viagem para passagens aéreas internacionais	R\$ 100.327,36	R\$ 870.237,36	CONTRATO Nº 029/2024 ()

6	0820.016258.00008/2024-61	IMC	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA;	ADESÃO à Ata de Registro de Preços Nº 005/2024, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 427/2023 tendo como órgão gerenciador a SEAGRI	ontratação de empresa especializada em prestação de serviços, sob demanda, de agenciamento de viagens, especializada em emissão de passagens aéreas nacionais, internacionais e intermunicipais, compreendendo serviços de reservas, marcação, cancelamento, remarcação, inclusão de tarifas de bagagens, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo "código localizador" e Seguro de Viagem para passagens aéreas internacionais, destinados a atender as necessidades operacionais do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais - IMC, no âmbito do Programa Global REDD for Early Movers - REM ACRE FASE II.	R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00	CONTRATO Nº 009/2024 (0010908431)
7	0722.017341.00008/2023-11	SEPI	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	Adesão à Ata de Registro de Preço nº 18/2023, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 096/2023, da SEPLAN.	Contratação de empresa para, sob demanda, prestar serviços de agenciamento de viagens, especializada em emissão de passagens aéreas nacionais e intermunicipais e, eventualmente, internacionais, bem como passagens terrestres nacionais e intermunicipais, compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo "código localizador", incluindo o seguro de assistência em viagem internacional, com proposta de menor valor de agenciamento, visando atender às necessidades da Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas - SEPI." visando atender as necessidades desta Secretária, no âmbito do Programa REM Acre Fase II.	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	CONTRATO Nº 10/2024/SEPI (0010765589)
8	0722.017341.00027/2024-10	SEPI	G.W. DA S. LIMA	Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 75 inciso VIII da Lei nº 14.133/2021	Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material de consumo diversos cestas básicas familiar, visando atender as populações indígenas no contexto urbano localizados no município de Tarauacá/AC, atingidos pelo transbordamento do Rio Gregório, decorrentes de forte chuvas, em cumprimento às atribuições da Secretaria Extraordinária dos povos Indígenas - SEPI., no âmbito do Programa REM Acre Fase II.	R\$ 429.680,00	R\$ 429.680,00	CONTRATO Nº 11/2024/SEPI (0011065184)
9	0820.016258.00002/2024-94	IMC	M. D. DE CARVALHO	Adesã ao Ata SRP 026/2023, Pregão, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º. 467/2023, como Órgão Gerenciador SEMULHER/AC.	Contratação futura e eventual, sob demanda, de empresa especializada em serviço de Buffet completo, com serviços de alimentação em geral (Coffee Break e Kit Lanche), para atender as ações desenvolvidas pelo Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais – IMC, no âmbito Sub Programa Fortalecimento do SISA e mecanismos REDD do Programa Global REDD for Early Movers REM ACRE – FASE II, conforme Estratégia de Repartição de Benefícios e Plano de Investimento	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	CONTRATO Nº 10/2024 (0011185692)

10	0820.013384.00021/2024-50	IMC	GRREEN – BUSSINESS CONSULTORIA LTDA	Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 75 inciso II da Lei nº 14.133/2021	prestação de Serviços de transporte fluvial, por meio de barco com condutor, para servidores e/ou colaboradores nos municípios de Assis Brasil, Feijó, Cruzeiro do Sul, Manuel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Mâncio Lima e Tarauacá, visando atender as ações desenvolvidas pelo Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais – IMC, no âmbito Sub Programa Fortalecimento do SISA e mecanismos REDD do Programa Global REDD for Early Movers REM ACRE – FASE II.	R\$ 40.800,00	R\$ 40.800,00	CONTRATO Nº 11/2024 (0012036263)
11	0722.017341.00004/2024-13	SEPI	R & N LIMA LTDA	ADESÃO à Ata de Registro de Preços Nº 017/2023, decorrente do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 020/2023 tendo como órgão gerenciador a Prefeitura Municipal de Brasília - AC.	Locação de veículo pick-up tipo caminhonete (sem condutor/motorista), com as seguintes características mínimas: Cabine dupla; tração nas rodas 4x4; capacidade para 05(cinco) pessoas; motor turbo diesel; ar condicionado, direção hidráulica; sistema de som; potência 180CV. Ano de fabricação 2020 ou posterior; Capacidade de carga 1000 kg pelas cheias de rios e igarapés, decorrentes de forte chuvas, em cumprimento às atribuições da Secretaria Extraordinária dos povos Indígenas - SEPI	R\$ 75.600,00	R\$ 75.600,00	Contrato nº 013/2024 (0011176169)
12	0819.012803.00078/2024-38 0819.012840.00071/2024-89	SEJUSP CIOPAER	AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	ADESÃO à Ata de Registro de Preços Nº 03/2024, decorrente do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 435/2023 tendo como órgão gerenciador a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ	Contratação de serviços de fornecimento de passagem aéreas e hospedagem para operações, capacitação e demais eventos relacionados ao objeto da cooperação.	R\$ 47.042,75	R\$ 600.000,00	Contrato nº 067/2024 (0011610099)
13	0088.016781.00087/2023-79	SEPLAN/REM	AGIUS SERVIÇOS, LOGÍSTICA E EVENTOS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 353/2023 - SEPLAN ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2023	contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais permanentes e consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Unidade de Coordenação do Programa REM/Acre - Fase II e outras demandas da Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN	R\$ 1.745,90	R\$ 1.745,90	Contrato nº 31/2024 (0011388755)
14	0088.016781.00087/2023-79	SEPLAN/REM	INFOJURUA LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 353/2023 - SEPLAN ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2023	contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais permanentes e consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Unidade de Coordenação do Programa REM/Acre - Fase II e outras demandas da Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN	R\$ 8.306,88	R\$ 8.306,88	Contrato Nº 34/2024 (0011558776)

15	0088.016781.00087/2023-79	SEPLAN/REM	HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 353/2023 - SEPLAN ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2023	contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais permanentes e consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Unidade de Coordenação do Programa REM/Acre - Fase II e outras demandas da Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN	R\$ 5.742,00	R\$ 5.742,00	Contrato Nº 35/2024 (0011794558)
16	0088.016781.00087/2023-79	SEPLAN/REM	EVOLUX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 353/2023 - SEPLAN ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2023	contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais permanentes e consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Unidade de Coordenação do Programa REM/Acre - Fase II e outras demandas da Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN	R\$ 534,00	R\$ 534,00	Contrato Nº 36/2024 (0011718794)
17	0088.016781.00087/2023-79	SEPLAN/REM	DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 353/2023 - SEPLAN ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2023	contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais permanentes e consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Unidade de Coordenação do Programa REM/Acre - Fase II e outras demandas da Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN	R\$ 2.441,16	R\$ 2.441,16	Contrato Nº 37/2024 (0011718824)
18	0088.016781.00087/2023-79	SEPLAN/REM	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 353/2023 - SEPLAN ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2023	contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais permanentes e consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Unidade de Coordenação do Programa REM/Acre - Fase II e outras demandas da Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN	R\$ 638,86	R\$ 638,86	Contrato Nº 38/2024 (0011732181)
19	0088.016781.00087/2023-79	SEPLAN/REM	MS SERVIÇOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 353/2023 - SEPLAN ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2023	contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais permanentes e consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Unidade de Coordenação do Programa REM/Acre - Fase II e outras demandas da Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN	R\$ 3.072,00	R\$ 3.072,00	Contrato Nº 39/2024 (0011797274)

20	0088.016781.00087/2023-79	SEPLAN/REM	R3S TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 353/2023 - SEPLAN ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2023	contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais permanentes e consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Unidade de Coordenação do Programa REM/Acre - Fase II e outras demandas da Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN	R\$ 2.546,60	R\$ 2.546,60	Contrato Nº 40/2024 (0012038683)
21	0820.013388.00032/2024-36	IMC	PR. SERVICE LTDA	DISPENSA, com fulcro no art. 75 inciso II da Lei nº 14.133/2021	Contratação, sob demanda, de empresa para fornecimento de material de consumo ( Malharia, EPI's, expediente, Copa/Cozinha, processamento de dados etc), visando atender às eventuais necessidades do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Públicos - IMC, conforme Estratégia de Repartição de Benefícios e Plano de Investimento	R\$ 51.939,81	R\$ 51.939,81	Contrato Nº 012/2024 (0012036243)
22	0853.012653.00022/2023-65	SEAGRI	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 440/2023 - SEAGRI	contratação de empresa para aquisição de equipamentos para as atividades de meliponicultura, no âmbito Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental / REDD EARLY MOVERS (REM) Acre – Fase II (KFW).	R\$ 1.707,00	R\$ 1.707,00	Contrato Nº 019/2024 (0010475614)
23			BELRIO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			R\$ 123.645,00	R\$ 123.645,00	Contrato Nº 020/2024 (0010476995)
24			LUIZ TADEO DAMASCHI			R\$ 12.664,30	R\$ 12.664,30	Contrato Nº 021/2024 (0010478348)
25			BID SOLUÇÕES EM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			R\$ 29.642,17	R\$ 29.642,17	Contrato Nº 017/2024 (0010577498)
26			CABANA MAGAZINE LTDA			R\$ 3.799,60	R\$ 3.799,60	Contrato Nº 023/2024 (0010613845)
27			DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			R\$ 2.187,26	R\$ 2.187,26	Contrato Nº 024/2024 (0010614240)
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 4.622.182,65</b>	<b>R\$ 5.745.049,90</b>	
